

Pasi Risku ja Jenny Saarinen

LAPSIPERHEIDEN TOIMINTAPÄIVÄ SÄKYLÄSSÄ YHDESSÄ
PYHÄJÄRVEN JÄRVIPELASTAJIEN KANSSA

Hoitotyön koulutusohjelma
2016

LAPSIPERHEIDEN TOIMINTAPÄIVÄ SÄKYLÄSSÄ YHDESSÄ PYHÄJÄRVEN JÄRVIPELASTAJIEN KANSSA

Risku Pasi ja Saarinen Jenny
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Hoitotyön koulutusohjelma
Maaliskuu 2016
Ohjaaja: Santamäki, Kirsti
Sivumäärä: 45
Liitteitä: 6

Asiasanat: hyvinvointi, järvipelastajat, toimintapäivä, lapsiperhe

Toimintapäivän perusajatuksena oli Pyhäjärven ympäryskuntien lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Samalla on haluttu vahvistaa perheiden yhteenkuuluvuutta ja tarjota perheille mukavaa yhteistä tekemistä. Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on terveydenhuoltolakiin perustuvaa toimintaa. Perheen hyvinvointiin vaikuttaa sekä lapsen, että vanhempien hyvinvointi. Lapsen hyvinvointia voidaan edistää ymmärtämällä lapsen tarpeita sekä tukemalla vanhempien jaksamista. Toimintapäivän idea tuli opintojen aikana aiemmin tehdystä näytöstehtävästä, jossa piti suunnitella toimintapäivä vapaaehtoisjärjestölle. Varsinainen toimintapäivä suunniteltiin lopulta hyvin pitkälti alkuperäisten ideoiden pohjalta.

Toimintapäivä järjestettiin yhteistyössä Pyhäjärven Järvipelastajien sekä muiden paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimintapäivään suunniteltiin erilaisia rastipisteitä, joita lapset pääsivät toteuttamaan samalla harjoitellen taitoja, joita tarvitaan vesillä liikkeessä.

Toimintapäivä järjestettiin Säkylässä elokuussa 2015 Pyhäjärven Järvipelastajien pelastusaseman piha-alueella. Tapahtumaan osallistui yhteensä 55 lasta ja 55 aikuista. Toimintapäivästä kerättiin palautetta yhteistyökumppaneilta, yleisöltä sekä haastatteleamalla Järvipelastajien puheenjohtajaa tapahtuman jälkeen.

Saatu palaute oli kaiken kaikkiaan positiivista ja tuli ilmi, että tämän kaltaiselle tapahtumalle on kysyntää. Jatkossa, jos tällaista tapahtumaa järjestetään uudelleen, olisi markkinointiin panostettava hieman lisää jolloin saataisiin vielä enemmän lapsiperheitä liikkeelle. Myös yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävään yhteistyöhön tulisi panostaa enemmän, jolloin voitaisiin saada vielä kokonaisvaltaisempi ja tiiviimpi tapahtuma.

ACTIVITY DAY FOR FAMILIES WITH CHILDREN IN SÄKYLÄ WITH PYHÄJÄRVI LAKE RESCUERS

Risku, Pasi ja Saarinen Jenny

Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunta University of Applied Sciences

Degree Programme in Nursing and Health Care

March 2016

Supervisor: Santamäki, Kirsti

Number of pages: 45

Appendices: 6

Keywords: welfare, lake rescuers, activity day, families with children

The basic idea in activity day was to promote health and welfare of families with children in lake Pyhäjärvi area. At the same time, is wanted to strengthen the cohesion of families and provide a pleasant to do for families. The health of the population and the promotion of welfare is based on the law. The welfare of the family is based by the welfare of the children and the parents. The child's welfare can be promoted by understanding the child's needs, and by supporting parents to cope. The idea for the activity day came during the studies previously done screen role, which had to plan an activity day to non-profit organization. The activity day was planned on the basis of original ideas.

The activity day was organized with lake Pyhäjärvi Lake rescuers, as well as with other commercial partners. To the activity day was planned different action spots, which children can do at same time practicing the skills that are needed in waters.

The activity day was held in Pyhäjärvi Lake rescuers rescue station area in August 2015. The event was attended by a total of 55 children and 55 adults. Feedback was collected from partners, the public and interviewing the Lake Rescuers chairman after the event.

The feedback was positive and revealed that there is a demand for this kind of event. If such an event will be held again in the future, the marketing should be focused a little bit more so that even more families to participate. Also, the cooperation with partners should be paid more attention, so the event could be more comprehensive and better.

SISÄLLYS

1	JOHDANTO.....	5
2	PROJEKTIN TEOREETTINEN PERUSTA	6
2.1	Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	6
2.2	Perheen hyvinvointi	7
2.3	Tapahtuma.....	8
2.4	Meri- ja Järvipelastus	8
3	PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITTEET	10
4	PROJEKTIN TOTEUTUSSUUNNITELMA	10
4.1	Toimintapisteet	12
4.2	Kohderyhmät.....	13
4.2.1	Pyhjäjärven Järvipelastajat	14
4.2.2	Säkylän ja Köyliön alueen lapsiperheet	14
4.3	Projektin suunniteltu aikataulu	15
4.4	Projektin riskit.....	16
4.5	Resurssit	18
4.6	Talousarvio	19
4.7	Mainonta	21
4.8	Toimintapäivän suunniteltu ohjelma.....	21
5	PROJEKTIN TOTEUTUS	22
5.1	Valmistelut	22
5.2	Toimintapäivän näkyvyys	24
5.3	Toimintapäivä	26
5.4	Toimintapäivän jälkeen.....	31
5.5	Jälkipalaute yhteistyökumppaneille	32
6	ARVIOINTI	32
6.1	Perustamisen arviointi.....	33
6.2	Suunnittelun arviointi.....	33
6.3	Yhteistyökumppaneiden arviointi	34
6.4	Osallistujien arviointi.....	35
6.5	Talousarvion toteutuminen	36
6.6	Projektipäällikkö Pasi Riskun arviointi	37
6.7	Projektsihteeri Jenny Saarisen arviointi.....	39
7	POHDINTA.....	40
	LÄHTEET.....	43
	LIITTEET	

1 JOHDANTO

Idea tähän projektimalliseen opinnäytetyöhön lähti keväällä 2014 koulussa tehdystä näyttötehtävästä, jossa piti pareittain suunnitella kampanja tai toimintapäivä valitsemalleen vapaaehtoisjärjestölle. Valitsimme tuolloin vapaaehtoisjärjestöksi Pyhäjärven Järvipelastajat, joka toimii Säkylässä. Opinnäytetyönä päätettiin toteuttaa tämä jo alustavasti suunniteltu toimintapäivä ja myös kohdeorganisaation puolelta tällaiselle toimintapäivälle oli tilaus. Toimintapäivä toteutettiin hyvin pitkälti alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Tavoitteita ja tarkoitusta muokattiin soveltuvammiksi, jotta niihin saatiin enemmän terveystietoa.

Toimintapäivän perusajatuksena oli väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, lähtien yksilön ja yhteisön kautta kohdistuen etenkin paikallisiin lapsiperheisiin. Tavoitteena oli edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta ja samalla tarjota perheille mukavaa yhteistä tekemistä. Tavoitteena oli myös järvenrantakunnassa valistaa lapsia turvallisesta vesillä liikkumisesta ja näin ehkäistä hukkumiskuolemia. Henkilökohtaisina tavoitteina opinnäytetyön tekijöillä oli myös oppia järjestämään onnistunut toimintapäivä, jossa osattaisiin huomioida kaikki tapahtuman järjestämiseen liittyvät asiat, kuten onnistunut markkinointi, varainhankinta, yhteistyökumppaneiden saanti ja riskien kartoitus. Toisena oppimistavoitteena olivat projektin rakenteeseen ja sen vaiheisiin tutustuminen, projektin johtajana toimiminen, sekä tapahtuman eri vaiheiden suunnittelu, organisointi ja toteutus.

Pyhäjärven Järvipelastajat on kolmannen sektorin vapaaehtoisjärjestö, jonka perusajatuksena on turvallisuus ja ihmisläheisyys. Nämä perusajatuksukset sopivat myös erinomaisesti opinnäytetyön lähtökohdiksi.

2 PROJEKTIN TEOREETTINEN PERUSTA

Toteutettava projekti on kehitysprojekti, jonka tarkoituksena on luoda uusi aiemmin toteuttamaton tapahtumapäivä. Projektiin on varattu riittävästi aikaa, tällöin projekti voidaan luokitella myös normaaliksi projektiksi. (Ruuska. 2012, 24–25.)

Projektin suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään projektin elinkaaren vaiheistusta Ruuskan mukaan: Perustaminen – Suunnittelu – Toteutus – Päättäminen. Tämän lisäksi projektin päättämisvaiheessa kirjoitetaan opinnäytetyön loppuraportti.

2.1 Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

”Kokonaisvastuu väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä on kunnilla.” Kuntien tulee huolehtia terveyden ja hyvinvoinnin edellytysten huomioimisesta kaikkien hallinnonalojen toiminnassa. (Ståhl, Wiss, Hakamäki & Saaristo, 2015, 1.) Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on terveydenhuoltolakiin perustuvaa toimintaa yksilön, väestön ja yhteisön toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Tarkoituksena on vaikuttaa taustatekijöihin, tapaturmien ja terveysongelmien ehkäisemiseksi sekä suunnitelmallista voimavarojen kohdentamista terveyttä edistävällä tavalla. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 3§.)

Rajamäki, Laukka ja Raudaskoski tuovat omassa opinnäytetyössään esille käsitteet promootio ja preventio. Promootiolla pyritään vaikuttamaan elinoloihin ja kokemuksiin jo ennen ongelmien ja sairauksien syntyä. Ongelmalähtöisessä preventiossa jaetaan tietoa olemassa olevasta ongelmasta. (Rajamäki, Laukka & Raudaskoski, 2014, 10, Sirviö 2010, 138.) Painopiste terveyden edistämisessä pyritään siirtämään ongelmien hoidosta hyvinvoinnin edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen aloitteellisella, suunnitelmallisella ja jatkuvalla työllä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 18).

2.2 Perheen hyvinvointi

Perheen hyvinvointiin liittyy sekä lapsen että vanhempien hyvinvointi. Lapsen hyvinvointia voidaan edistää ymmärtämällä lapsen tarpeita, tukemalla vanhempien jaksamista sekä kiinnittämällä huomiota terveystottumuksiin. Vanhempien hyvinvointiin sisältyy lisäksi kodin ilmapiiri, vanhempien vuorovaikutus ja kasvatuskäytännöt. Sekä lapsiin että vanhempiin kohdistuvat hyvinvoinnin osa-alueet pohjaavat perheen hyvinvointiin ja sen edistämiseen. Perheen hyvinvoinnin keskeisiä kulmakiviä ovat myös yhteisöihin kuulumisen ja toimijuus. (THL [www-sivut 2015.](#))

Hyvinvointi voidaan jakaa kolmeen osatekijään; terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin ja subjektiivisesti koettuun hyvinvointiin tai elämänlaatuun. Hyvinvointi-käsite voidaan jakaa vielä yksilölliseen ja yhteisötason hyvinvointiin. Yksilötason hyvinvointiin kuuluu sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen ja sosiaalinen pääoma. Yhteisölliseen hyvinvointiin liittyy työllisyys, työolot sekä toimeentulo. (THL [www-sivut 2016.](#)) Ekberg omassa opinnäytetyössään Peipohjan alueen varhaiskasvatuksen asiakasperheille järjestämässään toimintapäivässä tuo vahvasti esille yhteisöllisyyttä ja sen kautta tulevaa luottamusta ihmisiin ja yhteenkuuluvuutta yhteisössä. Tapahtumaan osallistui arviolta yli 150 kävijää. Hän toi esille liikunnan tärkeyden, vanhempien esimerkin kantavana voimana liikuntakäyttämisen kehittymiselle sekä yhdessä tekemisen merkityksen vuorovaikutuksen paranemiselle. Tapahtumassa oli mm. motoriikkarata, pomppulinna ja urheiluseurojen esittelypisteitä. (Ekberg. 2014, 6, 10, 25, 27, Liite 5.)

Enenevässä määrin yksilön hyvinvointia mitataan elämänlaadulla, johon taas liittyy terveys ja materiaallinen hyvinvointi, sekä yksilön omat odotukset siitä, millaista on hyvä elämä, ihmissuhteet, omanarvontunto sekä mielekäs tekeminen. Väestöryhmien väliset erot edellä mainituilla hyvinvoinnin osa-alueilla ovat suuret. Aineellisilla hyvinvoinnin ulottuvuuksilla (omaisuus, tulot, asumistaso) sekä niiden hankkimisen edellytyksillä (koulutus, ammatti ja asema työelämässä) on johdonmukainen ja selkeä yhteys yksilön hyvinvointiin, terveyteen ja niiden määrittäjiin. (Terveiden ja Hyvinvoinnin laitoksen [www-sivut 2016.](#))

2.3 Tapahtuma

Tapahtuma on käsitteenä laaja ja tapahtumaksi lasketaan melkein mikä tahansa tapahtuma pienestä yksittäistilaisuudesta isoihin massatapahtumiin asti. Tilaisuuksiin sisältyy yleensä määritelmä tapahtuman ajallisesta tilapäisyydestä, sosiaalisuudesta, sisälön moninaisuudesta ja julkisuudesta. Tapahtumassa on järjestäjä, katsojia ja ohjelma. Tapahtuma koostuu ihmisistä ja heidän erilaisista verkostoista, esim. yleisöstä, talkoolaisista ja muista sidosryhmistä. Sosiaalisuus ja ihmisten tarve tehdä asioita yhdessä ovat tapahtumien ydin. (Kipeläinen, Kostiainen, Laakso. 2012, 6.) Tapahtumassa on mukana aktiviteetteja, jotka tuovat sisältöön elämyksellisyyttä (Vallo & Häyrinen. 2012. 212).

Itäsen ja Maijalan opinnäytetyössä, jossa he järjestivät toimintapäivän Edvin Laineen koulun erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille, tulee hyvin esille tapahtuman suunnitteluvaiheen tärkeys. Heidän toimintapäivässään järjestettiin omat yleisurheilu-kisat Edvin Laineen koulun kehitysvammaisille lapsille. Heidän tarkoituksenaan oli tukea yhteisöllisyyttä ja sosiaalista vuorovaikutusta yhteisöllisellä tapahtumalla. Kilpailulajeja ja toimintapisteitä he suunnittelivat ja järjestivät yhteensä kymmenen erilaista. Niissä lajit ja toimintapisteet oli suunniteltu oppilaiden erityistarpeiden mukaisesti ja niin, että jokaiselle varmasti löytyisi mieluista tekemistä. Osallistujat oli jaettu iän mukaan eri ryhmiin. Onnistunut tapahtuma tulee suunnitella huolellisesti, ottaen huomioon kohdeyleisön monimuotoisuus ja erilaiset kiinnostuksen kohteet. Toimintapäivään osallistui yhteensä 15 erityistä tukea tarvitsevaa lasta ja heidän avustajansa. Itäsen ja Maijalan opinnäytetyössä kohderyhmänä olivat erityistä tukea tarvitsevat lapset, jolloin siinä korostuu erityisesti tapahtuman mielekkyyden tärkeys. (Itänen & Maijala, 2012, 6, 14–16, 18–20.)

2.4 Meri- ja Järvipelastus

Meripelastustoiminta kuten muukin pelastustoiminta Suomessa perustuu lainsäädäntöön, säädöksiin ja asetuksiin sekä niihin annettuihin tarkentaviin ohjeisiin. Toiminnasta vastaa aina jokin viranomainen, kuten poliisi, pelastuslaitos tai Rajavartiolaitos.

Varsinaisen meripelastuksen eli merialueen toiminnan osalta toiminta perustuu meripelastuslakiin (Meripelastuslaki 1145/2001) ja sen nojalla annettuun meripelastusasetukseen (Meripelastusasetus 37/2002). Lainsäädännön mukaan johtavana meripelastusviranomaisena toimii Rajavartiolaitos (Meripelastuslaki 1145/2001 3§). Lisäksi meripelastuslainsäädännöstä löytyy vapaaehtoistoimintaa koskevat säädökset, joiden perusteella Meripelastusseura toimii (Meripelastuslaki 1145/2001 6§ ja Meripelastusasetus 37/2002 10§-12§).

Sisävesillä pelastustehtävistä niin maalla kuin merellä vastaa pelastustoimi ja vastaa-vasti kadonneen henkilön etsinnästä poliisi. Sisävesillä sovellettava lainsäädäntö pelastustehtävien osalta kuuluu pelastuslain (Pelastuslaki 379/2011 25§) piiriin sisältäen myös vapaaehtoisten käytön pelastustoimen tehtävissä. Etsintätehtävien osalta säädöksen löytyvät poliisilaista. (Pelastuslaki 379/2011 46§ ja Poliisilaki 872/2011 4§.)

Pelastustoimen tehtäviä hoitavat järvipelastusyhdistykset ovat tehneet lisäksi paikallisen pelastuslaitoksen kanssa sopimuksen tehtävien hoitamisesta ja valmiuden ylläpidosta. Poliisin tehtävien osalta Poliisihallitus on antanut lainsäädäntöä tarkentavan ohjeen vapaaehtoisten käyttämisestä poliisijohtoisissa tehtävissä. (Poliisihallituksen ohje 2020/2011/250 luku 2.2.)

Siipola on tutkinut vuonna 2012 omassa opinnäytetyössään vapaaehtoisten sitoutumista meri- ja järvipelastustoimintaan. Tutkimuksen mukaan vapaaehtoisten tärkeimmät motiivit toimintaan lähtemiseen ovat auttaminen, harrastus ja itsensä kehittäminen. Jäsenistön jaksamista motivoi vapaaehtoistyö mielekkäänä harrastuksena, auttamisen tärkeys, ryhmään kuuluminen ja monipuolinen merellinen koulutus. Kyselystä kävi ilmi, että tärkeimpiä kehitysalueita meri- ja järvipelastusyhdistysten toiminnassa ovat rekrytointiprosessi, työnjako, palautteen anto ja henkinen tuki. (Siipola. 2012. 24–25, 28, 34, 37.)

3 PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Oppimistavoitteena ovat projektin rakenteeseen ja sen vaiheisiin tutustuminen, projektin johtajana toimiminen, sekä tapahtuman eri vaiheiden suunnittelu, organisointi ja toteutus. Lisäksi tarkoituksena on oppia järjestämään onnistunut toimintapäivä, jossa on huomioitu riskit ja osattu ennakoida ne sekä huomioida tapahtuman järjestämiseen liittyvät viranomaisyhteistyötahtojen kanssa toimiminen sekä varainhankinnan ja sponsoinnin perusteet.

Tavoitteena projektilla on edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta, sekä tarjota lapsiperheille virkistävää yhteistä tekemistä. Lisäksi tavoitteena on järvi-kunnassa edistää ja valistaa turvallista vesillä liikkumista koko perheelle. Yhdenkin hukkumiskuoleman ehkäiseminen tällaisella tapahtumalla on jo tuottanut tulosta. Toiveenamme on myös saada toimintapäivästä niin onnistunut, että siitä voisi tulla joka-vuotinen järvipelastajien tapahtuma tulevillekin vuosille.

4 PROJEKTIN TOTEUTUSSUUNNITELMA

Toimintapäivän ohjelma on suunniteltu lapsiperheille. Ohjelma koostuu erilaisista toimintapisteistä (Liite 1), joissa sekä lapset että aikuiset pääsevät tutustumaan ja opettelemaan toimintaa veden varassa, harjoittelemaan solmujen tekoa ja tutustumaan järvipelastajien kalustoon. Toimintapisteet on suunniteltu lapsia kiinnostaviksi ja heille sopiviksi lapsen iästä riippumatta. Toimintapisteet on suunniteltu yhdessä Pyhäjärven Järvipelastajien puheenjohtajan Kimmo Koiviston kanssa. Häneltä on saatu arvokasta tietoa siitä, mitä välineistöä on mahdollista saada Pyhäjärven Järvipelastajien kautta, esimerkiksi kelluntapuvut ja vedenalainen kamera. Pyhäjärven Järvipelastajien vapaaehtoiset tulevat avustamaan toimintapäivässä pitämällä rastipisteitä. Tapahtuman onnistumista arvioidaan haastatteleamalla puheenjohtaja Kimmo Koivistoa tapahtuman jälkeen, syksyn 2015 aikana, lisäksi tehdään palautekysely yleisölle (Liite 3) sekä yhteistyökumppaneille (Liite 2).

Projektiorganisaatio on koottu opinnäytetyön ja toimintapäivän ympärille. Organisaatio on tilapäinen ja muuttuu projektin eri vaiheissa (Ruuska 2012, 21–22). Projektiorganisaatio rakentuu opinnäytetyön tekijöiden ympärille. Projektipäällikkönä toimii Pasi Risku, joka vastaa pääasiallisesti projektin järjestelyistä. Projektsihteerinä toimii Jenny Saarinen, joka taas vastaa pääasiallisesti projektin raportin toteuttamisesta. Projektiryhmään kuuluu lisäksi asiantuntijoita suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa. Suunnitteluvaiheessa projektiryhmään kuuluu Pyhäjärven Järvipelastajien puheenjohtaja Kimmo Koivisto, joka toimii asiantuntijana järvipelastukseen liittyvissä asioissa. Toteutusvaiheessa projektipäällikkö ja -sihteeri toimivat tapahtuman ajan koordinaattoreina ja tapahtuman juontajina, järvipelastajista tapahtumassa on mukana vapaaehtoisia arviolta 14–24 henkilöä. Taulukossa 1 on esitetty tehtävien jako tarkemmin. Lisäksi yhteistyökumppaneista tapahtumassa on mukana 4–5 henkilöä.

Vaatetuksesta sovittiin, että jokainen vapaaehtoinen järvipelastaja pukee tapahtumaan järvipelastajien asunsa, jotta kävijät tunnistavat heidät. Lisäksi projektipäällikkö ja -sihteeri pukevat Järvipelastajien mainos t-paidat ja nimikyltit, joista kävijät erottavat järjestäjät. Tästä asiasta Itänen ja Maijala olivat saaneet omassa opinnäytetyö projektissään kritiikkiä ja palautetta siitä, että järjestäjillä olisi saanut olla yhtenäiset asut (Itänen & Maijala 2012, 24). Tämän heidän saamansa palautteen perusteella tässä projektissa päätettiin panostaa yhtenäisiin asuihin.

4.1 Toimintapisteet

Taulukko 1. Opinnäytetyön tehtävien jako

	Pasi Risku	Jenny Saarinen	Pyhäjärven Järvipelastajien edustaja	Pyhäjärven Järvipelastajien jäsenet
Projektipäällikkö	x			
Projektisihteeri		x		
Markkinointi ja mainonta	x	x		
Facebook		x		
Budjetti ja talous	x			
Viranomaisyhteistyö (sis. Turvallisuussuunnitelma, pelastussuunnitelma)	x	x		
Riskianalyysi	x	x		
Järvipelastuksen asiantuntija			x	
Toimintarastit				x

Toimintapisteet on suunniteltu yhdessä Pyhäjärven Järvipelastajien puheenjohtajan Kimmo Koiviston kanssa. Toimintapisteiden suunnitteleminen aloitettiin miettimällä sovitun toimintapaikan fyysisiä ominaisuuksia ja Järvipelastajien omia resursseja, kuten kuinka monta rantapistettä ja kuivanmaan toimintapistettä alueelle mahtuu.

Buffetin järjestämisen on päätetty antaa Mannerheimin lastensuojeluliiton Säkylän osastolle, jolloin tapahtumaan saadaan hyödyllisiä yhteistyökumppaneita mukaan. ILO Adventuresin Antti Henrikssonin on pyydetty mukaan pitämään omaa kanoottipistettä, jolloin yksi rantapaikka saadaan käyttöön ja samalla lisää mielenkiintoista toimintaa tapahtuman. Järvipelastajien puheenjohtaja Kimmo Koivisto ehdotti, että mukaan pyydetään Antin konditoriota Forssasta myymään jäätelöä, jolloin toimintapäivään saadaan vielä lisää erilaista toimintaa.

Projektiä varten suunniteltuja varsinaisia toimintapisteitä tulee olemaan: etsintätehtävä veneestä, pelastusliivien käyttö, solmujen teko, pelastusliinan heitto, vedenalaisella

kameralla etsintä, pintapelastuspukujen käyttö, tietoisuus meri- ja järvipelastuksesta videon muodossa. Etsintätehtävässä lapset ja aikuiset pääsevät pelastusaluksen kyytiin ja saavat etsiä järvelle vietyjä kelluvia pelastusnukkeja. Solmujen teko pisteellä lapsille opetetaan solmujen tekoa solmunaruilla, jotka he saavat lopuksi ottaa mukaansa. Pelastusliinan heitto-rastilla lapset pääsevät kokeilemaan pelastusliinan tarkkuusheittoa. Pintapelastuspuku -rastilla lapset pääsevät kokeilemaan pintapelastuspuvun pukemista ja sen kanssa kellumista rantavedessä. Pelastusaseman sisällä näytettävällä videolla tulee pyörimään video meri- ja järvipelastustoiminnasta. Pelastusliivien pukemista pääsee harjoittelemaan ennen pelastusveneeseen nousua. Lisäksi pelastusasemalla tulee olemaan järvipelastajien vapaaehtoinen kertomassa kiinnostuneille lisää heidän toiminnastaan. Toimintapisteet on kuvattu vielä tarkemmin liitteessä 1.

Rastipisteiden vastuut on jaettu niin, että projektipäällikön vastuulla on etsintätehtävä, vedenalaisen kamerasen käyttö, tietoisuus ja solmujen teko-rastit. Projektisihteerin vastuulla taas on pelastusliinan heitto, pintapelastuspuvut ja seuran esittely -rastit. Jakamalla rastipisteiden vastualueet saadaan tarkempaa raporttia rastipisteiden kulusta tapahtumapäivän aikana.

4.2 Kohderyhmät

Toimintapäivän kohderyhmät voidaan jakaa kahteen eri tasoon saamansa hyödyn perusteella: välittömät hyödynsaajat ja lopulliset hyödynsaajat (Silfverberg 2007, 147–148). Välitön hyödynsaaja on Pyhäjärven Järvipelastajat, jotka ovat tapahtuman kohdeorganisaatio. Järvipelastajat saavat kokemusta tapahtuman järjestämisestä sekä mainonnan että tilaisuuden kannattavuudesta. Lopullisia hyödynsaajia ovat myös Säkylän ja Köyliön lapsiperheet, joille tapahtuma on kohdennettu. Toimintapäivän luonne ja toimintarastit on suunniteltu kohderyhmää ajatellen eli lapset ovat pääkohderyhmä. Lapset toimivat aktiivisena toimijaryhmänä.

4.2.1 Pyhäjärven Järvipelastajat

Perheiden toimintapäivä on sisällytetty Pyhäjärven Järvipelastajien vuoden 2015 kausikalenteriin yhdeksi toimintakauden päätapahtumaksi (Koivisto henkilökohtainen tiedonanto 22.4.2015).

Pyhäjärven Järvipelastajat on aloittanut toimintansa vuonna 2008 ja sen tehtävänä on ihmishenkien pelastaminen ja vesillä liikkumisen valistuksen antaminen. Päätehtävien ohella Järvipelastajat avustavat veneilijöitä mm. teknisten vikojen aiheuttamissa vaaratilanteissa, etsinnöissä sekä aina kun syystä tai toisesta vesillä tarvitaan apua. Yhdistyksen toiminta on läheisesti sidoksissa pelastuslaitokseen ja se on pelastusviranomaisien koordinoimaa toimintaa. Pyhäjärven Järvipelastajien toiminta-alueina ovat Pyhäjärven ja lähivesistöjen vesialueet. Pelastusasema on keskellä 30km pitkän ja vajaa 10km leveän Pyhäjärven itärannalla Säkylän keskustassa. Pyhäjärven Järvipelastajat on Suomen Meripelastusseuran jäsen. (Pyhäjärven Järvipelastajat www-sivut 2014.)

4.2.2 Säkylän ja Köyliön alueen lapsiperheet

Kohderyhmäksi on valittu Säkylän ja Köyliön lapsiperheet, joihin myös markkinointi kohdistetaan. Säkylässä ja Köyliössä asui 30.4.2015 Väestörekisterikeskuksen mukaan yhteensä 7187 asukasta. Tilastokeskuksen mukaan Säkylässä asui vuonna 2013 lapsiperheitä 601 ja Köyliössä 369 lapsiperhettä. Kohderyhmään kuuluvia lapsia oli Säkylässä vuonna 2013 Tilastokeskuksen mukaan 496 ja Köyliössä 299. Taulukossa 2 on esitetty tarkemmin lapsiperheiden ikäryhmiin, perhetyyppeihin. Kohdealueina on käytetty Säkylää ja Köyliötä. Tarkasteluvuodeksi on valittu 2013, koska tältä vuodelta löytyivät uusimmat tilastot Tilastokeskukselta.

Taulukko 2. Lasten lukumäärä Köyliössä ja Säkylässä vuonna 2013.

Hakuperuste: Lapset muuttujina Alue, Lapsen ikäryhmä, Vuosi ja Perhetyyppi (Tilastokeskuksen www-sivut 2015)

	IKÄ	Lapset yhteensä	Lapset kahden vanhemman perheissä	Avopari ja lapsia	Avopari ja lapsia	Lapset yhden vanhemman perheissä	Äiti ja lapsia	Isä ja lapsia
Köyliö	5 - 6	47	44	37	7	3	2	1
	7 - 8	55	47	35	12	8	7	1
	9 - 12	109	94	84	10	15	11	4
	13 - 15	88	68	60	8	20	17	3
	YHTEENSÄ	299	253	216	37	46	37	9
Säkylä	5 - 6	82	68	62	6	14	13	1
	7 - 8	84	65	49	16	19	18	1
	9 - 12	184	154	125	29	30	25	5
	13 - 15	146	123	104	19	23	16	7
	YHTEENSÄ	496	410	340	70	86	72	14

4.3 Projektin suunniteltu aikataulu

Opinnäytetyön aihe on valittu marraskuussa 2014 ja aihe-seminaari on pidetty tammi-kuussa 2015. Kevään 2015 aikana tulee olemaan tapahtuman tarkempaa suunnittelua. Suunnitteluseminaari on suunniteltu pidettäväksi toukokuussa 2015.

Toimintapäivä tullaan pitämään elokuussa 2015, jonka jälkeen syksyn aikana on tarkoitus kirjoittaa projektin kirjallinen tuotos valmiiksi ja pitää raportointiseminaari joulukuussa 2015.

Taulukossa 3 on esitetty tarkempi tuntisuunnitelma, jonka pohjalta pystytään jakamaan tehtävät ja panostamaan projektin toteuttamiseen ja projektiraportin tuottamiseen.

Taulukko 3. Opinnäytetyön tuntisuunnitelma

		Projektipäällikkö	Projekti sihteeri				
Vaihe	Aika	Pasi Risku	Jenny Saarinen	Yhteiset palaverit	Omatoiminen työskentely		Selite
Perustamisvaihe	Marraskuu 2014	20	20	10	10	10	
	Joulukuu 2014	20	20	10	10	10	
	Tammikuu 2015	30	30	10	20	20	Aiheseminaari
	Helmikuu 2015	30	20	10	20	10	
Suunnitteluvaihe	Maaliskuu 2015	30	30	5	25	25	
	Huhtikuu 2015	30	30	10	20	20	
	Toukokuu 2015	40	40	10	30	30	Suunnitteluseminaari
	Kesäkuu 2015	30	30	10	20	20	
	Heinäkuu 2015	20	20	10	10	10	
Toteutusvaihe	Elokuu 2015	40	40	20	20	20	Tapahtumapäivä
Päättämisen vaihe	Syyskuu 2015	30	30	10	20	20	
	Lokakuu 2015	25	30	10	15	20	
	Marraskuu 2015	25	30	10	15	20	
	Joulukuu 2015	30	30	10	20	20	Raportointiseminaari
	YHTEENSÄ	400	400	145	255	255	

4.4 Projektin riskit

Yleisötapahtumassa on monenlaisia riskejä. Suurin riski ulkotapahtumassa on sää. Tapahtuman päivämäärä on päätetty ja on varauduttava erilaisiin säätiloihin. Sekä sateinen että kuuma sää karsii kävijöiden määrää. Riskiä ei voida välttää, mutta sitä voidaan ennakoida seuraamalla säätiedotusta ja varautumalla sen mukaan sateisella säällä esimerkiksi sadetakkeihin ja katoksiin. Kuumalla säällä taas varaudutaan varaamalla vesipisteitä tapahtuma-alueelle. (Vallo & Häyrynen 2012, 140.)

Pyhäjärven Järvipelastajille voi tulla pelastustehtävä kesken tapahtumapäivän, joten se tulee luokitella riskiksi (Koivisto henkilökohtainen tiedonanto 25.3.2014). Riskiä ei voida mitenkään välttää ja pelastustehtävän tullessa pelastusvene sekä kolme vapaaehtoista lähtevät pelastustehtävälle. Tällöin veneajelutusrasti täytyy jättää tauolle. Toisaalta, jos hälytystehtävä tulee, yleisö näkee, kuinka Järvipelastajat toimivat hälytyksen sattuessa.

Tapahtumissa on aina varauduttava myös tapaturmiin ja sairaskohtauksiin. Tapaturmia voidaan ennakoida suunnittelemalla rastit hyvin ja mahdollisimman turvallisiksi. Sairaskohtausten varalle käymme ensiapu- ja toimintaohjeet läpi vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoisilla Järvipelastajilla on ajantasaiset ensiaputaidot hallinnassa.

Veden lähellä ja veden varassa toimittaessa on myös hukkumisriski, varsinkin kun ollaan lasten kanssa tekemisissä, niin tulee olla erityisen varovainen. Riskiä voidaan välttää suunnittelemalla tarpeeksi vapaaehtoisia veden lähellä oleville rasteille, sekä muutama vapaaehtoinen valvomaan yleisesti rannan lähellä olemista.

Markkinointi on myös otettava riskinä. Mainonnasta riippuen kävijöitä voi olla liian vähän tai liian paljon. Olemme päättäneet rajata mainonnan Säkylän ja Köyliön alueelle. Paikallisen Alasatakunta-lehden levikkialue on myös Eurassa, Lapissa ja Yläneellä, joten kävijämäärää on vaikea ennustaa. Suureen kävijämäärään voidaan varautua varaamalla tarpeeksi vapaaehtoisia tapahtumapäivälle, jotta voidaan sujuvasti palvella kaikkia kohtuullisessa ajassa. Liian vähäisellä kävijämäärällä projektin tarkoitus ei toteudu. Sosiaalisen median hyödyntäminen lisää näkyvyyttä ja tiedottamisen nopeutta sekä tiedon päivittäminen on helppoa, mutta tiedon ja mainonnan leviämislle ei ole rajaa (Vallo & Häyrinen 2012, 84).

Mettovaara ja Ylisaari ovat omassa ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössään järjestäneet Iloa perheille ideointi-illan jossa Utajärven kuntalaiset pääsisivät ideoimaan oman kuntansa palvelujen kehittämistä. Iloa perheille –projektissaan oli laitettu ideointi-iltaan ennakoilmoittautuminen, ja paikalla heidän tilaisuudessaan oli 14 osallistujaa, joista suurin osa oli Utajärven kunnan tai seurakunnan edustajia. (Mettovaara & Ylisaari 2014, 8, 23, 29.) Tässä projektissa päädyttiin pitämään tapahtuma avoimena kaikille ilman ennakoilmoittautumista.

Tapahtuman päivämäärää suunniteltaessa mietittiin riskinä myös muita tapahtumia samaan aikaan. Tammikuussa 2015 otettiin yhteyttä Säkylän kulttuurisihteeri Mirja Vuoriseen, jonka kanssa käytiin kesän tapahtumakalenteri läpi ja mietittiin sopiva ajankohta tapahtumalle. Suunniteltuna viikonloppuna ei ollut muuta isompaa ohjelmaa lähikunnissa ja koulut olivat alkamassa seuraavalla viikolla, joten oletettavasti muualla kesälomaa viettämässä olevat perheet saattaisivat olla tuolloin jo palanneet koteihinsa.

Jänkälä omassa toiminnallisessa opinnäytetyössään erityistä tukea tarvitseville kouluikäisille ja lapsille sekä heidän perheilleen oli suunnitellut kuljettavan radan luonnossa ja rastijärjestyksen. Tämä rastijärjestys tukee hänen suunnittelemansa toimintapäivän kulkua, koska askarteluun tuli kerätä materiaali reitin varrelta, metsästä. Askartelumateriaali käytettiin lähtöpaikalla olevalla askartelupaikalla. Hänen toimintapäivä järjestettiin yhdessä Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n kanssa Kuuslahden leirikeskuksen lähiympäristössä. (Jänkälä 2012, 27, 30–31.)

Toimintapäivässä on päädytty siihen, että rasteille ei laadita mitään järjestystä, vaan yleisö saa suorittaa rastit haluamassaan järjestyksessä. Tämä on myös riski, jos kaikki haluavat samalle rastille samaan aikaan, siitä voi kertyä jonoja ja ruuhkaa.

4.5 Resurssit

Resurssi on yleisnimitys tavoitteellisessa toiminnassa tarvittaville voimavaroille. Resurssi terminä kattaa henkilövoimavarojen lisäksi myös esimerkiksi toiminnassa käytettävät materiaalit, toimitilat ja rahoituksen. (Projekti-instituutti [www-sivut](http://www.sivut) 2015.)

Projektin edetessä tehtävät on jaettu eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektipäällikön ja –sihteerin tehtävänä on suunnitella ja rakentaa projektipäivä toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa on otettu huomioon sekä mahdollisuudet että riskit.

Pelastussuunnitelman laatimiseen ohjeet on saatu puhelimitse aluepalomestari Harri Saloselta 8.5.2015. Samalla on kerrottu toimintapäivän alustava kulku ja aikataulu. Pelastussuunnitelma on toimitettu sähköpostitse 4.8.2015 aluepalomestarille, eikä suunnitelmassa ollut huomautettavaa.

Kokemäen poliisin asiakaspalvelusta on kerrottu 8.5.2015, että tapahtuman pienuudesta johtuen, siitä ei tarvitse tehdä yleisötilaisuusilmoitusta. Poliisin mukaan tilaisuudessa ei tarvitse olla järjestyksenvalvojia.

Perheiden päivä toteutetaan yhteistyössä Pyhäjärven Järvipelastajien kanssa Säkylässä sijaitsevan pelastusaseman piha-alueella. Järvipelastajat ovat antaneet näkemyksensä

toimintapisteistä ja mahdollistaneet esimerkiksi veneajelutuksen. Järvipelastajien vapaaehtoiset tulevat pitämään rasteja, koska heillä on asiantuntemus ja kokemus rastien sisällöstä.

Järvipelastajien kautta saadaan lainattua valtaosan tarvittavasta välineistöstä; pelastusvene, pelastusliivit, vedenalainen kamera, pelastusasemalla pyörivä video sekä heitto-liina. Meripelastusseura on luvannut toimittaa lasten pintapelastuspukuja tapahtuman ajaksi.

Taulukossa 4 on esitetty toimintapäivän muut yhteistyökumppanit sekä heidän rooli toimintapäivässä. Yhteistyökumppaneina on sekä yksityishenkilöitä, yhteisöjä että yrityksiä.

Taulukko 4. Toimintapäivän muut yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppani	Rooli
Antti Henriksson	Toimintapäivän alueen haltija
ILO Adventures	Kanootti- ja melonta, oman toimintansa esittely
Säkylän MLL	Buffet, oman toimintansa esittely
Metkahinta	Tapahtuman tukeminen palkinnoilla
LähiTapiola LÄNNEN	Tapahtuman tukeminen solmunaruilla
Antin konditoria	Jäätelön myynti, oman toimintansa esittely

4.6 Talousarvio

Projekti toteutetaan vapaaehtoisvoimin ja lahjoituksilla. Pyhäjärven Järvipelastajilla itsellään on paljon toimintapäivään tarvittavista tarvikkeista jo valmiina. Solmujen teko-rastille pyydetään LähiTapiola LÄNNELTÄ lahjoituksena 300 narunpätkää. Paikallisesta sekatavarakauppa Metkahinnasta pyydetään arpajaispalkintoja. Kulut koostuvat suurimmaksi osaksi talkootyöstä ja materiaalihankinnoista. Tulot koostuvat pääosin sponsoroinnista ja omarahoitusosuudesta. Omarahoitusosa koostuu mainostus, tulostus ja matkakuluista. Talousarvio on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5. Opinnäytetyön talousarvio

Opinnäytetyön talousarvio		
Kulut		3440
	Mainostus	20
	Tulostus	30
	Tarrat/leimasimet	20
	Matkakulut	300
	Postitus	50
	Materiaalihankinnat	600
	Tilat ja alueet	500
	Talkootyö	1920
Tulot		3440
	Omarahoitus	150
	Lahjoitukset	100
	Sponsorointi/tuki	3190
Tase		0

Talkootyön laskentaperusteena on käytetty Leader Pyhäjärvisseudun ry:n pitämästä rahoitusinfosta 10.3.2015 saadulla tiedolla talkootyönkustannusperusteista. Talkootyön laskennallinen tuntikustannus on 10€/tunti. Talkootyön tunnit lasketaan varsinaisen toimintapäivän valmistelusta, toteutuksesta sekä purkamisesta ja siivouksesta. Matkakulujen laskentaperusteena on käytetty yleistä kilometrikorvausta 0,44€/km (Verohalinto www-sivut 2015).

4.7 Mainonta

Tapahtumaa markkinoidaan Säkylän ja Köyliön lapsiperheille. Tapahtumasta tulee pieni teksti paikalliseen Alasatakunta-lehteen. Lisäksi Säkylän ja Köyliön alueen päiväkoteihin ja kauppojen ilmoitustauluille tullaan jakamaan mainoksia tapahtumasta (Liite 6).

Tapahtuman tiedot julkaistaan toukokuun aikana kouluissa jaettavassa kesän toimintaa esitteessä. Pyhäjärven Järvipelastajat on lisännyt tapahtuman oman mainos-lehtensä kalenteritapahtumiin. Lisäksi Facebookiin luodaan tapahtumasta omat tapahtumasi-vut.

4.8 Toimintapäivän suunniteltu ohjelma

Perheiden toimintapäivä järjestetään lauantaina 8.8.2015 Pyhäjärven Järvipelastajien pelastusasemalla ja sen piha-alueella Säkylässä osoitteessa Rantatie 238. Tapahtuma on avoinna kello 12.00–15.00.

Perjantaina 7.8. kokoonnutaan vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa piha-alueelle ja jaetaan tarkat paikat pisteille ja niillä toimiville henkilöille, jotta jokainen tietää paikkansa. Kaikki tarvittavat tavarat kerätään paikoilleen ja valmistellaan kaiken niin pitkälle kuin voidaan. Tällöin käydään läpi vielä riskit ja miten niihin on varauduttu.

Lauantaina 8.8. kaikkien on tarkoitus saapua paikalle kello 9.00 ja päivän kulku käydään vielä kerran läpi. Piha-alue ja rastipisteet järjestetään kuntoon aamupäivän aikana. Tapahtuma aukeaa yleisölle kello 12.00. Vapaaehtoiset toimivat omilla pisteillään ja projektin vetäjät tarkkailevat tapahtuman kulkua, sujuvuutta ja ovat sekä yleisön, että vapaaehtoisten käytettävissä.

Tapahtumaan tullessa lapsille jaetaan toimintapassit, joihin lapset voivat tarroja suoritettuaan pisteitä. Pisteillä olevat vapaaehtoiset antavat lapsille passiin tarran onnistuneen pisteen suorituksen jälkeen. Lapset saavat viedä passit kotiin tapahtuman jälkeen muistoksi.

Kello 14.30 arvotaan Metkahinnan lahjoittamat palkinnot. Arvontalaatikko on suunniteltu sijoitettavaksi pelastusasemalle toimistoon. Laatikoon laitetaan lappu, johon laitetaan nimi, osoite ja puhelinnumero, jotta voittaja voidaan tavoittaa, jos hän on jo lähtenyt tapahtumasta.

Tapahtuma päättyy virallisesti kello 15.00. Mikäli kävijöitä on vielä tapahtuma-alueella, niin pyritään siihen, että kaikki saavat rastit suoritettua klo 15.30 mennessä. Kävijöiden lähdettyä pidetään pieni palaveri vapaaehtoisten kanssa päivästä, sen kulusta ja vapaaehtoisten mietteistä. Vapaaehtoisille ja yhteistyökumppaneille jaetaan palautelomakkeet (Liitteet 2 ja 4), jotka he saavat ajan kanssa täyttää ja palauttaa projektin vetäjille. Palaverin jälkeen siivotaan pelastusasema, palautetaan lainatut tavarat ja pintapelasuspuvut kuivumaan. Syksyn 2015 aikana haastatellaan Pyhäjärven Järvipelastajien puheenjohtaja Kimmo Koivistoa. Hän vaikuttaa Säkylässä monessa järjestössä ja on paljon tekemisissä lapsiperheiden kanssa, joten häneltä tullaan saamaan palautetta kohderyhmiltä tapahtuman jälkeen.

5 PROJEKTIN TOTEUTUS

Marraskuussa 2014 on päätetty opinnäytetyön aihe ja lähdetty suunnittelemaan projektia, sekä otettu ensimmäisen kerran yhteyttä Pyhäjärven Järvipelastajiin ja kysytty heidän kiinnostustaan osallistua projektiin. Järvipelastajat olivat halukkaita yhteistyöhön, koska heidän mukaansa tällaisella tapahtumalla olisi kysyntää.

5.1 Valmistelut

Aiheen varmistumisen jälkeen on lähdetty keräämään materiaalia pohjaksi aiheseminaariin, joka pidettiin 7.1.2015. Helmikuussa 2015 pidettiin ensimmäisen palaveri Järvipelastajien puheenjohtaja Kimmo Koiviston kanssa. Tällöin keskusteltiin tapahtuman luonteesta, mahdollisuuksista ja Koivistolle esiteltiin suunnitelma mahdollisista rastipisteistä. Haastattelun ja Koivistolta saatujen kehitysideoiden pohjalta on lähdetty kehittämään rastipisteitä eteenpäin. Vastuualueita jaettiin ja sovittiin, että kevään 2015

aikana projektipäällikön tehtävä oli pitää yhteyttä yhteistyökumppaneihin ja viranomaisiin mahdollisten lupien saamisessa. Projektisihteerin tehtävänä oli pitää projektisuunnitelma ajan tasalla ja kirjoittaa tulevan suunnitteluseminaarin kirjallista tuotosta. Teoriatietoa etsittiin pääasiassa erikseen ja niitä koottiin yhteisissä palavereissa yhteen.

Kevään 2015 aikana pidettiin Järvipelastajien puheenjohtaja Kimmo Koiviston kanssa yhteensä kolme palaveria (6.2.2015, 12.2.2015 ja 22.4.2015). Palavereissa tarkennettiin vapaaehtoisten tärkeyttä ja tarvittavaa lukumäärää, muokattiin rastipisteitä sekä varmistettiin toimintapäivän tarkkaa ajankohtaa sekä mietittiin mainontaa.

Toukokuun 20. päivä pidettiin suunnitteluseminaari. Seminaarin perusteella suunnitelmaan tehtiin korjauksia. Mainokseen lisättiin järjestäjien nimet, turvallisuussuunnitelma tehtiin ja toimitettiin aluepalomestarille. Myös autojen pysäköintimahdollisuus lähialueelta kartoitettiin, Säkylän torivalvojalta saatiin suullinen lupa alueen käyttöön. Suunnitteluseminaarin jälkeen tehtiin virallinen sopimus projektista Järvipelastajien kanssa. Kesän 2015 aikana kerättiin tarvittavia välineitä toimintapäivää varten, ja tehtiin mainokset koteihin ja kauppojen ilmoitustauluille. Lisäksi askarreltiin lasten rastipasseja (Liite 5) ja käytiin ostamassa passeihin tarvittavat tarrat.

Heinäkuun 1. päivänä pidettiin yhteispalaveri Pyhäjärven Järvipelastajien jäsenten kanssa. Palaveri pidettiin Järvipelastajien kausikalenterin mukaisena koulutuspäivänä, jolloin mahdollisimman moni pääsi paikalla. Koulutuspäivä oli kuitenkin typistynyt pelastusvenekoulutukseen. Tällöin käytiin tarkkaan läpi toimintapäivän ohjelma sekä vapaaehtoisten rooli tapahtumassa paikalla olleiden kanssa. Vastuupisteitä vapaaehtoisten kesken ei kuitenkaan jaettu alkuperäisen suunnitelman mukaan, koska moni vapaaehtoisista puuttui paikalta eikä ollut selkeää listaa, ketkä vapaaehtoisista lopulta tulevat toimintapäivään mukaan. Listaa ja nimiä vapaaehtoisista tiedusteltiin useaan otteeseen kesän aikana ennen toimintapäivää, mutta sitä ei ollut saatavilla.

Heinäkuussa saatiin paikallisesta sekatavarakauppa Metkahinnasta lahjoituksena kaksi BanBao-koottavaa lelupakettia arvontapalkinnoiksi sekä vakuutusyhtiö LähiTapiola LÄNNEN lahjoitti 300 narunpätkeä solmunaruiksi tapahtumaan. Lisäksi heinäkuun aikana varmistettiin vielä se, että tapahtumaan saadaan Meripelastusseuralta heidän lupaamansa pintapelastuspuvut.

5.2 Toimintapäivän näkyvyys

Toimintapäivästä tehtiin tiedote Säkylän kuntaan kunnanjohtajalle 8.3.2015, joka toimii Säkylässä ilmestyvän 100 Uutista-lehden päätoimittajana. Tähän lehteen ei tekstiä kuitenkaan saatu mahtumaan. Säkylän alakouluissa ilmestyi ennen kevätlukukauden loppua mainos kesän tapahtumista lapsiperheille. Tähän mainokseen saatiin ilmoitus tapahtumasta. Tämä mainosteksti toimitettiin huhtikuussa mainoksen toimittajalle, projektityöntekijä Sanna Vähä-Vaheelle Säkylän kuntaan. Järvipelastajien omaan julkaisuun varsinainen juttu ei mahtunut. Lehdessä toimintapäivä oli kuitenkin lisätty tapahtumakalenteriin. Alueviestin yhteydessä ilmestyvässä Kesäviesti-liitteessä 3.6.2015 oli myös tapahtumakalenterissa maininta toimintapäivästä. Kuvassa 1 on ympyröitynä ilmoitus toimintapäivästä.

Toimintapäivälle luotiin Facebook-sivut projektisihteerin toimesta kesäkuun lopussa. Sivujen kautta tieto tapahtumasta levisi myös muille kuin vain Säkylän ja Köyliön alueen lapsiperheille. Tämä saattoi vaikuttaa myös kävijöiden jakaumassa paikkakunnittain.

Toimintapäivästä tehtiin projektipäällikön toimesta lehdistötiedote 6.8.2015 ilmestyneeseen Alasatakunta-lehteen. Lehden Menovinkit-palstalla oli ilmoitus toimintapäivästä sekä lyhyt kuvaus tapahtumasta. Kuvassa 2 on ympyröitynä ilmoitus toimintapäivästä.

Tapahtuu Säkylässä

Kesäkuu
Ikkoneita ja kiinalaista tussimaalausta-näyttely esillä kirjastolla 12.6. saakka.
Pois syrjästä-hankkeen julistekilpailun työt esillä Säkylän kirjaston näyttelytilassa 16.6. alkaen.
11.-13.6. Lastenleiri MOLSIS Pihlavassa. 7-9-vuotiaiden leirin teemana lapsen turvallisuus veden ääressä. Ilmoittautumiset Säkylän seurakunnan nettisivujen kautta.
15.-18.6. Vanhaisnuortenleiri "AI MÄÄ VAI?" Pihlavassa. 10-13-vuotiaille tarkoitettun leirin teemana on erilaisuuden hyväksyminen. Ilmoittautumiset Säkylän seurakunnan nettisivuilta.
23.-25.6. TOUR DE HENRIK-polkupyörävaellus vanhaa tienpohjaa seuraten Turkuun. Matka alkaa Henrikin saamahuoneelta Kokamäeltä, ja se on tarkoitettu 10-14-vuotiaille. Ilm. Säkylän seurakunnan nettisivujen kautta.

Heinäkuu
Pois syrjästä-hankkeen julistekilpailun työt esillä Säkylän kirjaston näyttelytilassa 5.7. asti.

Elokuu
Aikuisopiston näyttely Säkylän kirjastossa avoinna koko elokuun ajan.
3.-6.8. Lasten ja nuorten seikkailuleiri Pihlavassa. 10-15-vuotiaille tarkoitettu leiri. Ilmoittautumiset Säkylän kirjaston kautta.
8.8. Lapsiperheiden toimintapäivä Pyhäjärven järvipelastajien pelastusasemalla klo 12-15. Solmujen tekoa, pinta-pelastuspuvulla kellumista, vedenalaisen kameran kokeilua yms.

...roollakaan sovi vähätellä, ei taan **Pirjo**-äidinkään, joka klensa pallotella sisällä, sillä la, että Jokunen maljakko s la vaarassa tuhoutua.
"Ei pidä dramatisoida illo: kotona sai pelata vain pehi

Kesän vaiva Huittia aptee

Osoite Sän puh. 02-
Avoimna ma-pe ja su
Juhannusaa
Juhannuspäivä
www.huittia

Kuva 1. Kesäviesti 3.6.2016

Päiväri

6.8.2015
ALASATAKUNTA 17

6.8. – 10.8.

Menovinkit

La 8.8. Antiikki- ja keräilymessut
klo 9–16 Kauttuan Ruukinpuistossa. Teemana vanhat soittimet ja asiantuntijana mestaripelaaja Kalevi Kantola.

La 8.8. Lapsiperheiden toimintapäivä
klo 12–15 Pyhäjärven järvipelastajien pelastusasemalla (Rantatie 238, Säkylä). Vesiturvallisuuteen ja -pelastukseen liittyvää ohjelmaa, vedenalainen kamera ym. rastipisteitä.

Su 9.8. Alvar Aalto – arkkitehti ja muotoilija -luento
klo 15 Kauttuan Jokisaunalla (Sepäntie 1, Eura). Pekka Korvenmaan luento. Järj. Euran kunta.

Su 9.8. Köyliöjärven pyöräily
klo 9–13 voi valita pyöräilyreitiksi 31 kilometrin täyden reitin, 18/22 kilometrin puolikkaan reitin tai oman sovelletun reittinsä. Lähtö- ja ilmoittautumisaikana Kookantie 1 (Timo Lehtonen). Järj. Köyliön Lallien hiihto- ja ampumahiihtojaosto.

Kuva 2. Alasatakunta-lehti 6.8.2015 Menovinkit

5.3 Toimintapäivä

Valmistelut aloitettiin perjantaina 7.8.2015 kello 18, jolloin kokoonnuttiin yhteistyökumppaneiden kanssa pelastusasemalle. Paikalle saapuivat Pyhäjärven järvipelastajien edustaja Kimmo Koivisto, Säskylän MLL:n puolesta paikalla oli kaksi edustajaa. Paikalle eivät päässeet Antin Konditorian henkilöt, jotka olivat vasta matkalla Säskylään. LähiTapiola LÄNNEN näkyvyys mainosplakaatin muodossa oli sovittu jo aiemmin sähköpostitse. Pyhäjärven Järvipelastajien vapaaehtoisista paikalle ei päässyt yhtään rastien pitäjiä. Vapaaehtoisia yritettiin puheenjohtaja Kimmo Koiviston kautta saada kiinni ja yritettiin varmistaa heidän osallistumista seuraavana päivänä, mutta edelleen oli hyvin epävarmaa, kuka tulisi tapahtumaan. Valmisteluissa sovittiin vain rastien paikat.

Perjantaina sovittiin yhteistyökumppaneiden myyntipisteiden paikat ja tarvittava kalusto, sekä paikat järjesteltiin niin pitkälle kuntoon kuin oli mahdollista. Piha-alue on kuitenkin avoin, joten ulos ei voitu jättää mitään tavaroita. Pyhäjärven Järvipelastajat lahjoittivat vielä kolme järvipelastajien t-paitaa arvottavaksi tapahtumapäivässä.

Lauantaina 8.8.2015 toimintapäivän valmistelut aloitettiin pelastusasemalla aamulla kello 10.00. Tällöin laitettiin toimintarastien paikat lopulliseen kuntoon valmiiksi. Valmisteluun kului aikaa kaksi tuntia. Järvipelastajien vapaaehtoisia tuli paikalle lopulta puheenjohtajan lisäksi kuusi henkeä. Vapaaehtoiset päätettiin jakaa niin, että veneajeluun meni kaksi henkeä, pintapelastuspukujen pukemista oli järjestämässä yksi henkilö, vedessä oli yksi henkilö vahtimassa pintapelastuspuvuilla kellujia. Solmujen teko- ja pelastusliinanheitto –rastit yhdistettiin ja rastia piti yksi henkilö ja laiturilla oli yksi henkilö auttamassa pelastusliivien oikeassa pukemisessa ja samalla hän ohjasi vedenalaisen kameran käyttöä.

MLL:n, Antin konditorian ja ILO Adventuresin pisteisiin projektin vetäjät eivät puuttuneet muuten kuin ostajan roolissa, ostamalla arpoja, makkaraa ja jäätelöä. Kuva 3 on tapahtuman keskipisteestä, jossa vasemmalla on Antin konditoria. Tämän takana on Pyhäjärven Järvipelastajien pelastusasema. Taustalla näkyy laitur, josta etsintärastille lähdettiin. Oikealla näkyy pintapelastuspuvun pukemisen harjoittelua.



Kuva 3. Antin Konditoria ja taustalla Järvipelastajien pelastusasema

Kellon lähestyessä puolta päivää, päätettiin hetkeä ennen toimintapäivän alkamista, että projektin vetäjät menevät vuorotellen sisääntulon yhteyteen kadulle toivottamaan tulijoita tervetulleiksi tapahtumaan. Samalla saatiin pidettyä ”tukkimiehen kirjanpitoa” tapahtumaan tulleiden kävijöiden määrästä. Sisääntulon yhteydessä jaettiin lapsille rastipassit, kerrottiin toimintarastipisteistä ja niiden sijainnista sekä muista yhteistyökumppaneista ja heidän tarjoamasta toiminnasta. Tapahtuman ajan projektin vetäjät vuorottelivat paikkaa sisääntulon yhteydessä, jotta toinen pääsi kiertämään rastipisteitä.

Ensimmäiset kävijät tulivat jo 11.45 jäätelöostoksille, tässä kohtaa oltiin kuitenkin onneksi jo pääasiassa valmiita tulevaan päivään. Kävijöitä tuli tasaisesti koko kolmen tunnin ajan ja ihmiset tuntuivat viihtyvän hyvin. Rastipisteitä kierrettäessä huomasi selkeästi, että etsintärasti oli kaikkien ehdoton suosikki ja siellä käytiin useammankin kerran.

Toinen suosittu piste oli pintapelastuspukujen käyttö ja kelluminen. Lasten pintapelastuspukuja saatiin kolmea eri kokoa (100cm, 120cm ja 140cm) yhteensä kuusi kappaletta, joten kaikenkokoiset lapset pääsivät kokeilemaan pukuja. Kuva 4 on pintapelastuspukurastilta, johon oli varattu penkki ja alusta pukeutumista varten. Aremmat lapset

eivät uskaltaneet kokeilla, mutta todella moni kokeili pintapelastuspukuja ja olivat kovasti innoissaan. Aika pian tapahtuman alettua, vapaaehtoiset hakivat varastostaan myös isommille lapsille ja aikuisille sopivia pintapelastuspukuja, jotta hekin pääsivät kokeilemaan. Tapahtumassa oli myös innokkaita aikuisia, jotka halusivat päästä kokeilemaan pintapelastuspukuja. Vedessä oleva vapaaehtoinen oli isommille kellujille turvana ja pienemmille kellujille apuna.



Kuva 4. Pintapelastuspuvun pukemista ennen veteen menoa.

Muihin pisteisiin verrattuna hieman vähemmän suosiota osoittivat vedenalaisen kameran kokeileminen laiturilla, sekä solmujen teko ja pelastusliinan heitto, mutta näilläkin pisteillä oli tasaisesti kävijöitä. Myös videota käytiin ahkerasti katsomassa ja hake-massa lisätietoa pelastustoiminnasta pelastusasemalla olevalta toiminnan puheenjohtajalta, joka kertoi innokkaasti kaikille heidän toiminnastaan.

Solmujenteko-rastilta halukkaat saivat omakseen solmunarun. Tällä narulla harjoiteltiin solmujen tekoa sitä tarkoitusta varten tehdyllä alustalla. Kuvassa 5 Pyhäjärven Järvipelastajien henkilö opastaa erilaisten solmujen tekoa sekä aikuiselle että lapsille.



Kuva 5. Solmunarurasti

Toimintapäivä meni nopeasti eteenpäin ja alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kello 14.30 arvottiin Banbao-koottava paketti, sekä t-paidat onnekkaille. Osa oli jo lähtenyt tapahtumasta, mutta kaikki voittajat tavoitettiin ja voitot saatiin toimitettua perille. Kävijät vähenivät arvonnin jälkeen selkeästi ja kello 15 pihalla ei ollut enää kuin ihan pari vierasta, joten tapahtuman purkutoimenpiteet päästiin aloittamaan heti kello 15.00.

Tapahtuman loputtua kiitettiin kaikkia mukana olleita vapaaehtoisia sekä paikalla olleita yhteistyökumppaneita ja kyseltiin palautetta tapahtuman kulusta. Tämän jälkeen kerättiin yhdessä rastipisteiden tavarat oikeille paikoilleen ja roskat roskikseen. Pintapelastuspuvut laitettiin kuivumaan. Pintapelastuspuvut oli sovittu toimitettavan seuraavalle käyttäjälle Pyhäjärven Järvipelastajien toimesta, kun ne olivat kuivuneet. Projektin vetäjät pääsivät myös itse pelastusveneeseen kyytiin, kun vedessä olleet pelastusnuket käytiin hakemassa pois. Kaiken kaikkiaan paikkojen kuntoon laittamiseen meni kaksi tuntia aikaa.


Toteutuksen arviointiin kerättiin tietoa ja palautetta itse toimintapäivästä kolmesta eri lähteestä: kohdeyleisöltä, kohdeorganisaatiolta ja itsearviointilla. Yleisöpalautetta kerättiin yksinkertaisella palautelomakkeella (Liite 3), joka oli sijoitettu pelastusase-

malle. Yhteistyökumppaneilta kerättiin palaute sekä haastatteluin heti tapahtuman jälkeen, että kirjallisesti yksinkertaisella palautelomakkeella (Liite 4). Järvipelastajien puheenjohtajalta pyydettiin kirjallista omasanaista palautetta vielä sähköpostilla parin kuukauden päästä.

Projekti rajattiin alun perin koskemaan Säkylän ja Köyliön lapsiperheitä. Kävijät tilastoitiin sisään tulon yhteydessä rajauksella aikuiset ja lapset. Tilastointia suoritettiin 20 minuutin portain, jolloin pystyimme seuraamaan kävijävirtaa tapahtuman aikana. Tilastointiin käytimme yksinkertaista kaavaketta ja ”tukkimiehen kirjanpitoa”. Kuviossa 1 on esitetty toimintapäivän kävijämäärät kellonajoittain.

Markkinointi oli kohtuullisen onnistunut. Kävijöitä koko toimintapäivän aikana oli yhteensä 110 henkilöä. Näistä 55 oli lapsia ja 55 aikuisia. Eniten kävijöitä tapahtumaan tuli ensimmäisen tunnin aikana. Tällöin tapahtuma-alueelle tuli 46 kävijää. Näistä 22 oli lapsia ja 24 aikuisia. Tapahtumassa oloaika ei varsinaisesti tilastoitu, mutta silmämääräisen arvion mukaan kävijät viihtyivät tapahtuma-alueella noin 1,5 – 2 tuntia.


Kuvio 1. Kävijämäärät lapsiperheiden toimintapäivässä 8.8.2015

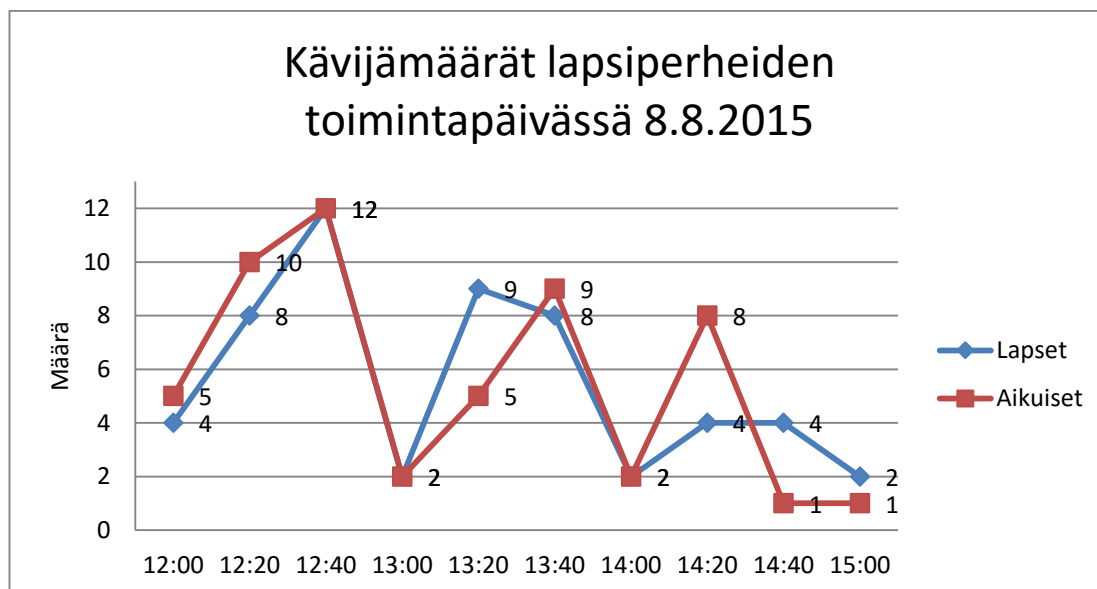

Toimintapäivään osallistuneista arvontaan osallistui yhteensä 73 henkilöä (66,4 % kävijöistä). Arvontalipukkeiden perusteella pystyttiin tilastoimaan osallistuneiden kotipaikkakunnat. Paikkakunnan ilmoittaneista Pyhäjärven ympäristökunnissa asui (Sä-

kylä, Köyliö, Eura, Yläne) 50 kävijää. Markkinoinnin kohdealueella (Säkylä ja Köyliö) paikkakuntansa ilmoittaneita oli 42 kävijää. Muilta paikkakunnilta tulleita oli siis vajaa puolet kävijöistä. Kuviossa 2 on esitetty graafisesti kävijöiden paikkakuntien jakautuminen.

Kuvio 2. Kävijöiden kotipaikkakunnat

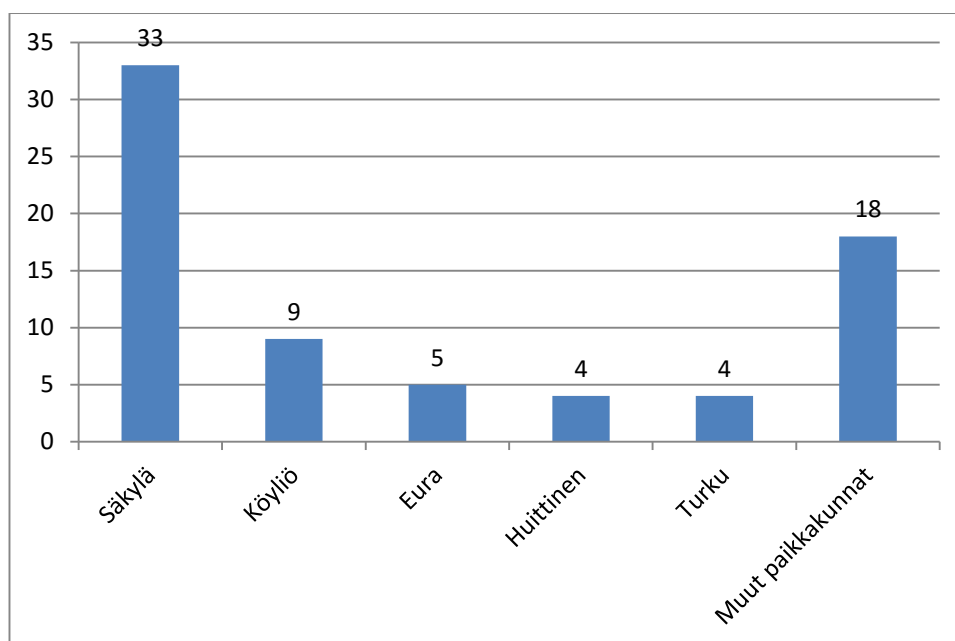

5.4 Toimintapäivän jälkeen

Viikko siitä, kun toimintapäivä oli pidetty, käytiin kirjalliset palautelomakkeet läpi ja niistä tehtiin yhteenvetoa raportointia varten, sekä kirjoitettiin ylös toimintapäivän kulua. Yleisöpalautteita ei valitettavasti ollut tullut kuin yksi kappale ja yhteistyökumppaneidenkin palautteet olivat aika niukat. Syyskuussa käytiin tapaamassa Järvipelastajien puheenjohtaja Kimmo Koivistoa, jolloin saatiin hyvää palautetta päivästä. Tapahtuma oli onnistunut tilaisuus, jossa kaikilla osallistujilla oli mieleistään tekemistä. Kaikki lähtivät tapahtumasta iloisella mielellä. Uusia kannatusjäseniäkin oli Järvipelastajille tullut tapahtuman myötä. Kolmen tunnin tapahtuma-ajasta vene-etsintärastin tehokasta etsintäaikaa oli ollut kaksi tuntia ja merimaileja oli kertynyt yhteensä 24. Tämän jälkeen projektin toteuttajien motivaatio ja osittain ajanpuutekin hidastivat työn kirjoittamista ja alkuperäinen ajatus raportointiseminaarin pitämisestä joulukuun 2015 mennessä oli hylättävä.

Tammikuussa 2016 tiivis työskentelyvaihe alkoi ja projektiraportti alkoi hahmottua. Uudeksi tavoitteeksi laitettiin raportointiseminaarin pito maaliskuussa 2016. Alkuvuosi meni työn muokkaamisessa, jäsentämisessä, lisäteorian etsimisessä ja työn laajentamisessa.

5.5 Jälkipalaute yhteistyökumppaneille

Toimintapäivästä eri tahoilta saatu palaute lähetettiin vielä sähköpostilla kaikille yhteistyökumppaneille elokuussa. Liitteenä olivat toimintapäivään osallistuneiden lasten ja aikuisten määrät sekä kotipaikkakunnat. Tämä oli osa jälkimarkkinointia, jonka tarkoituksena oli vielä osoittaa arvostusta tapahtumaan osallistuneille tahoille. Mukana olleita vapaaehtoisia, yhteisöjä ja yrityksiä tulee kiittää tapahtumasta sekä siihen osallistumisesta. (Vallo & Häyrinen 2012, 180–181.)

6 ARVIOINTI

Tällä projektimaisella opinnäytetyöllä on itsessään monta eri osa-aluetta joita arvioidaan. Arviointi suoritetaan Ruuskan tekemän projektin elinkaaren vaiheistuksen mukaan Perustaminen – Suunnittelu – Toteutus – Päättäminen. Arviointiin käytettiin liitteenä 2–4 olevia kyselylomakkeita.

Tapahtuma sujui kaikin puolin hyvin ja sää oli tapahtumalle suosiollinen koko tapahtuman ajan. Kävijöitä oli ajateltu saapuvan enemmän, mutta toteutunut määrä oli kuitenkin sopiva kaikin puolin, kun rastipisteillä oli vajaamiehitys.

Markkinointi olisi voinut olla tehokkaampaa ja yhteydenpito yhteistyökumppaneiden kanssa parempaa, näillä kahdella asialla olisi varmasti saatu vielä toimivampi toimintapäivä järjestettyä.

6.1 Perustamisen arviointi

Perustamisen arvioinnissa arvioitiin alkuperäistä keväällä 2014 tehtyä näyttötehtävää kampanja-/toimintapäivästä vapaaehtoisjärjestölle. Projekti on perustettu tätä työtä tehdessä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tarpeen tunnistamiseen suhteessa tapahtuman toteuttamiseen (Paasivaara, Suhonen, Virtanen 2011, 82–84). Ydinkysymyksenä: Onko alkuperäinen idea ja ideointi, luova työ, toiminut tapahtuman ytimenä.

Alkuperäisenä ideana oli suunnitella toimintapäivä lapsiperheille. Alkuperäiseen suunnitelmaan oli sisällytetty Viisaasti vesillä – valistuskampanja. Tämä jätettiin pois heti alussa, tilalle otettiin meri- ja järvipelastuksen esittely. Esittelyssä kuitenkin sivuttiin Viisaasti vesillä – kampanjaa. Pelastusvenekalustoon pääsi tutustumaan laiturilla sekä etsintärastin aikana. Muuten rastipisteet pysyivät aika lailla alkuperäisen suunnitelman mukaisina, ne vaativat vain hiomista.

Kokonaisuudessaan alkuperäinen idea toimi tapahtuman ytimenä. Luova työ innosti myös Pyhäjärven Järvipelastajien puheenjohtajaa kasvattamaan toimintapäivää välillä jopa liian suureksi mutta rastipisteiden määrän kasvattaminen olisi vaatinut enemmän vapaaehtoisia järvipelastajia mukaan toimintaan, eivätkä projektin vetäjien resurssit olisi riittäneet liian isoon tapahtumaan.

6.2 Suunnittelun arviointi

Projektin suunnitteluvaiheen arvioinnissa arvioitiin suunnittelun toteutumista, etenemistä, loogisuutta, aikataulutusta ja toimivuutta. Arviointi tehtiin työryhmän kesken subjektiivisena arviointina. Arvioinnissa tuotiin esille myös työryhmän henkilökohtaiset kokemukset projektin suunnittelun kulusta ja sen toteutumisesta.

Suunnittelu toteutettiin pitkälti suunnitellun aikataulun mukaisesti. Aikatauluun oli varattu enemmän aikaa, kuin siihen varsinaisesti käytettiin. Yhteiset tapaamiset toimintapäivään osallistuneiden kanssa jäivät varsinkin joidenkin yhteistyökumppaneiden kanssa liian vähäiseksi. Pyhäjärven Järvipelastajien kanssa yhteistyö sujui lähinnä puheenjohtaja Kimmo Koiviston kautta. Yhteisiin tilaisuuksiin ei osallistunut kuin satun-

naisia järvipelastajia. Tämä vaikeutti rastien suunnittelua ja toteutuksen hahmottamista. Antin konditorian kanssa yhteydenpidon hoiti Kimmo Koivisto. LähiTapiolan kanssa järjestettiin yksi tapaaminen, muu yhteydenpito suoritettiin puhelimitse ja sähköpostitse. Metkahinnan kanssa yhteistyö sujui hyvin, arvontoihin saadut palkinnot kohtasivat kohdeyleisön tarpeet.

Markkinointi onnistui toteutuneisiin resursseihin nähden hyvin. Tapahtumassa oli varauduttu n.300 kävijään, mutta ilman ennakkoilmoittautumista tätä oli hyvin vaikea ennustaa. Lopulta osallistujia oli yhteensä n.100 henkeä, ja tämä määrä jakautui sopivasti toimintapäivän kolmen tunnin ajalle. Rasteille ei kerääntynyt jonoja ja kaikki sujui hyvin. Jos vapaaehtoisia olisi tullut enemmän paikalle, rastipisteet olisivat vetäneet enemmänkin kävijöitä. Resursseihin nähden kävijämäärä pysyi sopivana, joten voi ajatella, että markkinointi oli onnistunut ja oli saavuttanut tavoitellun kohderyhmän. Mettovaaran ja Ylisaaren Iloa perheille –projektissa lähtökohtana on ollut selvittää Utajärven kunnan lapsiperheiden hyvinvointia ja kehittämismahdollisuuksia. Heidän markkinointinsa ei ollut saavuttanut tavoiteltua kohderyhmää eikä saanut heitä liikkeelle. Heidän projektissaan ei ehkä ollut tarpeeksi kiinnostavaa aihetta tai sitten markkinointia olisi pitänyt tehostaa tekemällä kutsuvampia mainoksia tapahtumasta. Myös heidän projektissaan, oli vapaaehtoiset saatu huonosti sitoutettua projektiin ja he joutuivat tekemään viime hetken muutoksia ohjelmaansa tämän vuoksi. (Mettovaara & Ylisaari 2014, 7, 53.) Tässä projektissa tavoitteena oli tuoda lapsiperheille yhteistä tekemistä ja näin ollen edistää perheiden hyvinvointia. Lähtökohdat projektissa ovat samoilla linjoilla Mettovaaran ja Ylisaaren projektin kanssa, mutta toteutus on ollut erilainen. Lähtökohdistaan huolimatta molemmissa projekteissa on ollut samankaltaisia haasteita tapahtuman markkinoinnin ja vapaaehtoisten sitouttamisen kanssa. Vapaaehtoiset eivät sitoutuneet tapahtuman toteuttamiseen.

6.3 Yhteistyökumppaneiden arviointi

Pyhäjärven Järvipelastajien puheenjohtajaa Kimmo Koivistoa haastateltiin heti toimintapäivän jälkeen. Kimmo oli tyytyväinen toimintapäivän kulkuun ja kävijämäärään. Hänen arvionsa mukaan kävijöitä olisi voinut olla enemmänkin, jos mainontaan olisi käytetty huomattavasti enemmän taloudellista panosta. Tällöin kävijämäärä olisi voinut hänen mukaansa nousta jopa 250.

Vapaaehtoiset Järvipelastajat pitivät tapahtumasta ja olivat tyytyväisiä saadessaan olla mukana järjestämässä tällaista tapahtumaa. Heidän mielestään rastit oli hyvin suunniteltu ja yhteistyö kaikkien toimijoiden kesken oli toimivaa. Parannusehdotuksina tuli vain mietittäväksi, että miten voisi saada aikuisia ja nuoria aikuisia enemmän mukaan toimintaan.

Säkylän MLL oli tyytyväinen tapahtumaan ja siihen osallistumiseen. Yhdistys sai toivomaansa näkyvyyttä. He järjestivät tapahtumassa kierrätysleluarpajaiset, joka oli suunnattu lapsille ja lapsenmielisille. Tällä he saivat asiakkaat hyvälle mielelle. Kahvin, leivonnaisten ja makkaroiden myynti jäi kuitenkin tavoitteesta.

Antin konditoria järjesti jäätelömyyntipisteen tapahtumassa. Jäätelön myynti ei haastattelun perusteella täysin vastannut heidän asettamia tavoitteita. Konditoria sai kuitenkin tapahtumassa näkyvyyttä ja markkinoitua omia tuotteitaan.

ILO Adventuresin Antti Henriksson oli tyytyväinen kävijämäärään sekä saamaansa näkyvyyteen. Kävijöitä toimintapisteellä kävi tasaisesti ja heitä riitti koko tapahtuman ajan.

6.4 Osallistujien arviointi

Yleisöpalautelaatikko oli jäänyt suurimmalta osalta kävijöistä huomaamatta, koska laatikkoon oli päätynyt vain yksi palautelappu. Laatikko olisi pitänyt sijoittaa näkyvämmälle paikalle ja jo tervetulon yhteydessä pyytää kävijöitä täyttämään palaute-lappu lähtiessään.

Koska paikkakuntamme on kuitenkin varsin pieni, niin suullista palautetta on saatu tutuilta ja tuttujen tutuilta toimintapäivästä ja se on ollut pelkästään positiivista. Varsinkin etsintärasti oli ollut monen mieleen. Etsinnän ohessa pääsi veneajelulle, joka kiinnosti monia.

Kävijöiden palautteen perusteella koko tapahtuma oli onnistunut ja tällaisia toivotaan paikkakunnallemme lisää. Myös Järvipelastajien toimintakuva oli kiinnostanut kävijöitä.

6.5 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion suurimman yksittäisen muutoksen teki talkootyötuntien väheneminen, kun vapaaehtoisia tuli odotettua vähemmän. Toisen suuren eroavaisuuden tekee matkakulujen poistuminen, kun meripelastajat ja järvipelastajat kustansivat pintapelastuspukujen lähetykset. Talousarvio oli yli kaksi kertaa suurempi kuin toteuma. Talousarvio ja toteuma on esitetty tarkemmin taulukossa 6.

Mainostuksesta ei aiheutunut lainkaan kustannuksia, koska erillistä mainosta paikallislehteen ei laitettu. Tulosteiden yhteismääräksi tuli 191 arkkia. Tämä koostui jaettavista mainoksista rastipasseista, arvontalipukkeista sekä palautteista. Tulosteen hinnaksi tuli 0,10€ kappaleelta. Tarrojen hankintahinta oli 7,90€ Porin Puuvillan Citymarketissa. Tulosteet ja tarrat kuuluivat omarahoitussuuteen. Matkakuluja ei kertynyt lainkaan, koska pintapelastuspuvut ja solmunarut toimitettiin meri- ja järvipelastajien toimesta ja he hoitivat kulut. Matkakulut oli budjetoitu pukujen hakua varten.

Materiaalihankinnat eivät maksaneet myöskään budjetoitua määrää, koska solmunarujen tilausmäärä nousi suureksi. Narujen toimittaja antoi naruista alennusta 25%. Palokintojen arvo kuitenkin kompensoi lahjoituksena saatuja materiaalihankintoja. Näistä kustannuksista vastasi vakuutusyhtiö LähiTapiola LÄNNEN.

Talkootyön osuus arvioitiin talousarviossa suureksi, koska toimintapisteille suunniteltiin useampi henkilö. Varsinaiseen toimintapäivään ei kuitenkaan osallistunut suunniteltua määrää vapaaehtoisia. Tämän vuoksi myös talkootyön osuus toteumassa on pieni.

Tilat ja alueet tarjosi alueen hallinnoija Antti Henriksson sekä pelastusaseman käyttäjä Pyhäjärjen Järvipelastajat.

Taulukko 6. Talousarvio ja toteutuma

Opinnäytetyön talousarvio ja toteuma			
		Arvio	Toteuma
Kulut		3440	1622
	Mainostus	20	0
	Tulostus á 0,10€/kpl	30	19,1
	Tarrat/leimasimet	20	7,9
	Matkakulut	300	0
	Postitus	50	15
	Materiaalihankinnat	600	450
	Tilat ja alueet	500	500
	Talkootyö	1920	630
Tulot		3440	1622
	Omarahoitus	150	27
	Lahjoitukset	100	510
	Sponsorointi/tuki	3190	1085
Tase		0	0

6.6 Projektipäällikko Pasi Riskun arviointi

Tapahtuman alustava suunnittelu aloitettiin eri opintojakson aikana. Tällöin tehtiin alustava suunnitelma tapahtumapäivästä. Jo tässä vaiheessa keskusteltiin Pyhäjärven järvipelastajien kanssa tapahtumasta. Kohdeorganisaatiolla heräsi kiinnostus toteuttaa tapahtuma.

Alustava suunnitelma oli rakennettu toiminnalliseksi, rastipaikat kartoitettu ja toiminta pohjustettu kohdeorganisaation puolesta. Suunnitteluvaiheessa paikallisten yhdistysten ja yritysten mukaan ottamista kartoitettiin. Mukaan lapsiperheiden tapahtumaan saatiin Mannerheimin lastensuojeluliiton Säkylän osasto. MLL Säkylä lupautui järjestämään buffetin tapahtuman ajaksi. Paikalliset yritykset lähtivät mukaan tukemaan tapahtuman järjestämistä helposti ja kohtuullisen avokätisesti. Yhteistyö sujui hyvin

kaikkien yritysten kanssa ja sitä oli riittävästi. Yhteistyökumppanit tiesivät mihin lähtivät mukaan ja osasivat asennoitua toimintapäivään. Projektipäällikön tietoon ei tullut, etteivät yhteistyökumppanit tienneet, mihin tapahtumaan ovat osallistumassa.

Yhteistyö projektisihteerin kanssa sujui hyvin. Pystyimme omasta mielestäni suunnittelemaan tapahtuman sellaiseksi, että sen toteutuminen on mahdollista. Kokoonnuimme tekemään suunnitelmaa lähes säännöllisesti ja tekemään toteutumiseen edellytettävät kirjalliset että materiaaliset asiat valmiiksi.

Suunnitteluvaiheessa työkiireet haittasivat yhteistyötä projektisihteerin kanssa. Lisäksi kesälomien sijoittuminen lähelle toimintapäivää pidensi suunnittelu-aikaa. Kohdeorganisaation yhteyshenkilöiden kiireet ja aikataulut hidastivat suunnittelua sekä vaikeuttivat tilanteen hallinnointia. Projektipäällikkönä olin tietoinen tilanteesta ja tiesin, ettei kohdeorganisaatio kiirehdi toimintapäivän suunnittelussa ja vapaaehtoisten rastinpitäjien keräämisessä. ”Pienessä maalaiskunnassa asiat järjestyvät nopeasti ja innokkaita löytyy loppujen lopuksi riittävästi”, totesi kohdeorganisaation yhteyshenkilö Kimmo Koivisto suunnittelupalaverissa 1.7.2015. Vapaaehtoisten sitouttaminen tapahtumaan on erittäin vaikeaa, jos he eivät koe tapahtumaa omakseen. Pienellä paikkakunnalla vapaaehtoisia on toiminnassa mukana rajoitettu määrä.

Toimintapäivänä ei kuitenkaan rastihenkilöstöä saapunut odotettua määrää paikalle. Tämän vuoksi jouduimme hieman muuttamaan aiempaa suunnitelmaa rastihenkilöiden suhteen. Henkilökohtaisesti uskon, että toimintapäivä olisi pystytty viemään läpi vieläkin pienemmällä vapaaehtoisten määrällä. Tällöin olisi pitänyt karsia rastipisteiden määrää tai yhdistää rastitoimintoja.

Toimintapäivänä rastipisteet saatiin valmisteltua suunnitellussa ajassa ja tapahtuma oli valmiina alkamaan aikataulussa. Projektipäällikkönä oli vastaanottamassa tapahtumaan tulijoita ja jakamassa rastikortteja. Toimintapäivä sujui ilman ongelmia, rastipisteillä riitti väkeä koko tapahtuman ajan eikä jonoja syntynyt.

Toimintapäivän jälkeen tehdyissä laskemissa kävijöistä ja heidän paikkakunnistaan, olin yllättynyt miten laajalta alueelta kävijöitä oli. Kävijämäärä toimintapäivässä oli mielestäni hyvä. Oma arvioni on, että jonoja olisi syntynyt, jos kävijöitä olisi ollut

enemmän. Toimintapäivän purku meni sujuvasti. Toiminta-alue siistittiin ja käytössä ollut materiaali toimitettiin omille paikoilleen kahden tunnin aikana.

Kirjallisen työn tekeminen toimintapäivän jälkeen on kangerrellut, mutta toimintapäivän tapahtumat ovat tuoreessa muistissa. Tekstin tuottaminen ei ole minulle ollut ongelma, vaan ajan löytäminen sille. Itselläni painopiste oli toimintapäivän toteuttamisessa, jonka jälkeen olin tyytyväinen itseeni ja työryhmääni. Kirjallisen osuuden oli tarkoitus olla valmis vuoden 2015 loppuun mennessä. Aikataulu ei kuitenkaan toteutunut, vaan kirjallista osuutta on tarkennettu kevään 2016 aikana.

6.7 Projektisihteeri Jenny Saarisen arviointi

Suunnitteluvaiheeseen olisin kaivannut ja tarvinnut vielä enemmän yhteydenpitoa projektipäällikön kanssa. Myös yhteistyökumppaneiden kanssa yhteydenpito jäi mielestäni hieman liian vähäiseksi. Henkilökohtaisesti olisin tarvinnut tapahtuman kulun läpikäymistä kohta kohdalta useamman kerran, jotta olisin itse ollut luottavaisempi siihen, että kaikki langat ovat käsissäni. Yhteistyökumppaneiden kiinnostuksen lisäämiseksi tapahtumaa kohtaan sekä projektiin sitouttaminenkin takia olisi ollut parempi, kun olisimme useammin tavanneet. Tapahtumaan odotettiin enemmän vapaaehtoisia ja rastit jäivät vähän vajaamiehitetyiksi. Useammalla kokoontumisella olisimme mielestämme saaneet vapaaehtoisia ymmärtämään projektin tarkoitus ja siihen sitoutumisen tärkeys ja merkitys. Nyt näillä muutamalla kokoontumisella tapahtuma jäi järvipelastajille hieman ehkä sellaiseksi, että he tulevat paikalle, jos ehtivät muilta kiireiltään ja osa peruikin ihan viime hetkellä tulemisensa ja paikalle tulleetkin olivat hieman epä-tietoisia päivän tarkoituksesta ja mitä tulee tehdä.

Kaikesta huolimatta päivä sujui paljon odotettua paremmin! Sää oli tapahtumalle paras mahdollinen ja vieraiden määrä oli vapaaehtoisiin järvipelastajiin nähden sopiva. Rasteille ei kerääntynyt isoja jonoja ja kävijät pystyivät halutessaan käymään samalla rastilla useammankin kerran (esim. etsintärasti veneellä oli hyvin suosittu!). Sopivan kävijämäärän ansiosta kaikki viihtyivät ja me projektipäällikön kanssa saimme myös laskettua kävijät ja ehdimme silti myös kiertää rasteja ja katsoa toimintaa. Parasta palautetta oli kun eräs lapsiperhe jonka olin kutsunut paikalle tuli asenteella/sanoen: ”no

me nyt tultiin sit katsomaan...” lopulta he viipyivät koko toimintapäivän aukioloajan ja olivat hyvin innoissaan tapahtumasta!

Tapahtuman purku saatiin tehtyä projektipäällikön kanssa heti parin päivän päästä tapahtumasta, mikä oli todella hyvä asia opinnäytetyön etenemisen kannalta. Syksyn aikana olemme molemmat työstäneet tekstiä tahoillamme. Välillä on tullut kausia, että motivaatio työtä kohtaan on ollut kateissa mutta, kun on pitänyt lopullisen tavoitteen mielessä, niin taas on jaksanut työstää opinnäytetyötä hieman eteenpäin. Alkuperäisen aikataulun mukaan raportointiseminaari oli tarkoitus pitää joulukuun 2015 mennessä, mutta se venyi joulukiireiden ja motivaation puutteen vuoksi, mutta saimme onneksi jatkettua heti tammikuussa.

Nyt kun ollaan loppusuoralla opinnäytetyössä, niin olisin tehnyt toisin sen, että olisimme pitäneet tiiviimmin yhteyttä yhteistyökumppaneiden kanssa. Itse toimintapäivästä, että yleisöpalautelomakkeet olisi annettu joko tullessa käteen tai sijoiteltu paremmin näkyville, koska niihin vastaaminen jäi vähäiselle. Suullinen palaute kuitenkin oli hyvää, joten uskon päivän olleen mukava monelle lapsiperheille.

7 POHDINTA

Toimintapäivän kestoksi kolme tuntia on sopiva aika nykyisillä resursseilla, koska toimintapisteille ei ole vaihtohenkilöstöä. Myös vapaaehtoisten sitouttaminen toimintapäivään tulisi jatkossa suunnitella tarkemmin. Miten sitouttaa Pyhäjärven Järvipelastajien vapaaehtoiset mukaan järjestämään yleisötapahtumaa? Onko yhdistyksellä palkitsemisjärjestelmää tai löytyykö se yhteistyökumppaneilta? Kuten Mettovaara ja Ylisaari ovat omassa ylemmän AMK-opinnäytetyönsä riskianalyysissä huomioineet organisaatioon ja henkilöstöön liittyvät riskit ja riskinhallintamuodot, ohjaajien määrä → keskenään sopiminen ja muiden paikalla olevien ammattihenkilöiden käyttö ryhmien/rastien vetäjinä (Mettovaara & Ylisaari 2012, 23–24). Tämä ei kuitenkaan ratkaise varsinaista sitoutumista toimintaan tai tapahtumaan. Siipola on tutkinut omassa

opinnäytetyössään vapaaehtoisten sitoutumista meri- ja järvipelastustoimintaan. Tärkeimmät syyt toimintaan sitoutumiselle olivat toiminnalle omaiset elämänarvot ja asenne, motivaatio ja toiminnan merkityksen ymmärtäminen ja hyväksyminen. Poisjäämisen syiksi nousivat ajan puute, elämäntilanteen muuttuminen ja toiminnan muuttuminen liian ammattimaiseksi. (Siipola 2012, 28–29.) Vapaaehtoisten mukaan saaminen on pienellä paikkakunnalla haastavaa. Sekä nuoret että aikuiset ovat mukana urheiluseura-, vapaapalokunta-, vanhempainyhdistys- ja muissa erilaisissa toiminnoissa. Osa on mukana useammassa toiminnassa, jolloin vapaaehtoistoiminnan arvottaminen on jokaisesta itsestään kiinni. Järvipelastuksessa mukana oleville vapaaehtoisille tulisi luoda selkeät linjat ja johdonmukaisuus toimintaan.

Myös ajankohta täytyy suunnitella tarkoin niin vapaaehtoisten kuin yleisön osallistumisen kannalta. Kesäloman viimeinen viikonloppu ei kaikelta osin ole paras vaihtoehto. Viimeisten lomapäivien viettäminen vapaaehtoistyössä ei kaikista tunnu mukavalta, vaikka kysymys olisi vain muutaman tunnin pätkästä. Järvivesi on tosin loppukesästä lämpimimmillään viileistä alkukesistä johtuen.

Toimintapäivän toteuttaminen pienellä paikkakunnalla, jossa järvellä liikkuminen on tuttu tapa, tuo tietoisuuteen pelastusorganisaation olemassa olon. Sitä kautta kannatusjäseneksi liittyminen lisääntyy. Toiminnan esittely on tärkeää, ettei vapaaehtoisten määrä vähenisi. Järvipelastajilla on kuitenkin tehdä valistus- ja ennaltaehkäisevää toimintaa sekä tarvittaessa pelastustoimintaa.

Toimintapäivästä ei saatu tarpeeksi palautetta kävijöiltä eikä yhteistyökumppaneilta, vaikka siihen oli annettu mahdollisuus. Palautteen kerääminen tarvitsisi seuraavalla kerralla järjestää eri tavalla, esimerkiksi jakamalla palautelaput tervetulon yhteydessä ja painottaa niiden palauttamisen tärkeydestä.

Markkinointia tehostamalla toimintapäivään olisi ollut mahdollista saada enemmän kävijöitä, mutta tämä olisi tarkoittanut sitä, että vapaaehtoisia olisi ehdottomasti tarvittu rastipisteille enemmän. Pyhäjärven Järvipelastajien tulisi tehostaa omaa toimintaansa ja saada jäsenensä sitoutumaan paremmin suunniteltuihin tapahtumiin.

Toimintapäivämme perusteella tämän kaltaiselle tapahtumalle olisi jatkossakin tilausta Pyhäjärvisseudun alueella, kävijöitä oli tapahtumassa lähes koko järven ympäryskunnista.

Riskianalyysiin oli saatu koottua riittävästi mahdollisia toimintapäivään vaikuttavia tekijöitä. Sää on olennainen osa ulkona tapahtuvassa toiminnassa ja meillä sää suosi täydellisesti. Mainonta ja markkinointi ovat merkittävässä osassa toimintapäivän onnistumisen kannalta. Lehdistötiedotteita on mahdollista tehdä myös ilman rahallista panostusta ja niitä kannattaisi saada lehtiin lähellä tapahtumaa, mutta myös hyvissä ajoin, jolloin ihmiset voivat varata päivän kalenteriinsa. Tuleva kesä näyttää sen, tulevatko Järvipelastajat järjestämään vastaavaa tapahtumaa jatkossa.

LÄHTEET

Henriksson, A. 2015. Ilo Adventures. Säskylä. Haastattelu 22.4.2015. Haastattelijoina Pasi Risku ja Jenny Saarinen. Muistiinpanot haastattelijoiden hallussa.

Ekberg, E. 2014. Hei me liikutaan yhdessä! Aurinkoinen liikunta- ja toimintapäivä Peipohjan alueen varhaiskasvatuksen asiakasperheille. AMK-opinnäytetyö. Viitattu 10.2.2016. <http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014120117767>

Itänen, J. & Maijala, A. 2012. Toimintapäivä Edvin Laineen koulun erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. AMK-opinnäytetyö. <http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201205229354>

Jänkälä, H. 2012. PERHEIDEN KESKEN Toimintapäivä erityistä tukea tarvitseville kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. AMK-opinnäytetyö. Viitattu 10.2.2016. <http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012120518421>

Kesäviesti 3.6.2015. Tampere: Kustannusliike Aluelehdet Oy

Kilpeläinen, P., Kostiainen, E. & Laakso, S. 2012. Kaupungissa tapahtuu. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset Helsingissä. Kaupunkitutkimus TA Oy. <http://www.kaupunkitutkimusta.fi/referenssi/kaupungissa-tapahtuu-tapahtumaklusteri-ja-tapahtumien-vaikutukset-helsingissa/>

Koivisto, K. 2014-2015. Puheenjohtaja, Pyhäjärven järvipelastajat ry. Säskylä. Haastattelut 25.3.2014, 6.2.2015, 12.2.2015, 22.4.2015, 1.7.2015, 7.9.2015. Haastattelijoina Pasi Risku ja Jenny Saarinen. Muistiinpanot haastattelijoiden hallussa.

Leader Pyhäjärvisoutu ry. Säskylä. Rahoitusinfo Säskylän kunnantalolla 10.3.2015. Muistiinpanot opinnäytetyön tekijöiden hallussa.

Meripelastuslaki. 2001. L 30.11.2001/1145

Meripelastusasetus. 2002. L 17.1.2002/37

Mettovaara, S. & Ylisaari, K. 2014. Iloa perheille –projekti. Ylempi AMK-opinnäytetyö. Viitattu 2.2.2016. <http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014060311645>

Paasivaara, L., Suhonen, M. & Virtanen, P. 2011. Projektijohtaminen hyvinvointipalveluissa. Helsinki: Tietosanoma Oy

Pelastuslaki. 2011. L 29.4.2011/379

Poliisilaki. 2011. L 22.7.2011/872

Poliisihallituksen ohje ”Kadonneen henkilön etsintä ja poliisitutkinta”. 2011. 2020/2011/250

Projekti-instituutti www-sivut. Viitattu 12.5.2015. www.projekti-instituutti.fi

Pyhäjärven Järvipelastajat www-sivut. Viitattu 18.12.2014. www.pyhajarvenjarvipelastajat.fi

Rajamäki, S., Laukka, M., Raudaskoski, A. 2014. ”ROPPAKAUPALLA KAVERUUTTA”: Toimintapäivä koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi. AMK-opinnäytetyö. Viitattu 10.2.2016. <http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014060111241>

Ruuska, K. 2012. Pidä projekti hallinnassa. 7. p. Vantaa: Talentum.

Salonen, H. Aluepalomestari, Säkylän paloasema. Säkylä. Henkilökohtainen tiedonanto 8.5.2015.

Silfverberg, P. 2007. Ideasta projektiksi: Projektinvetäjän käsikirja. Helsinki: Edita

Siipola, M. 2012. Vapaaehtoisten sitoutuminen meri- ja järvipelastustoimintaan: Case: Suomen Meripelastusseura ry. AMK-opinnäytetyö. Viitattu 12.5.2015. <http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201202242463>

Sirviö, K. 2010. Lapsiperheiden terveyden edistäminen – osallistamista ja ennakointia Teoksessa A-M Pietilä (toim.) Terveyden edistäminen. Teoriasta toimintaan. Helsinki: WSOYpro Oy, 130-150.

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2012. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Kaste 2012-2015. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:1.

Ståhl, T., Wiss, K., Hakamäki, P. & Saaristo, V. 2015. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa – rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinninlaitos.

Terveydenhuoltolaki. 2010. L 30.12.2010/1326.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivut. Viitattu 3.1.2015 ja 4.2.2016. www.thl.fi

Tilastokeskuksen www-sivut. Viitattu 13.5.2015. www.tilastokeskus.fi.

Vallo, H. & Häyrinen, E. 2012. tapahtuma on tilaisuus. 3. uud.p. Helsinki: Tietosanomama Oy.

Verohallinnon www-sivut. Viitattu 21.4.2015. www.vero.fi.

Vuorinen, M. 2015. Kulttuurisihteeri, Säkylän kunta. Puhelinhaastattelu 16.1.2015. Haastattelijoina Pasi Risku ja Jenny Saarinen. Muistiinpanot haastattelijoiden hallussa.

Väestörekisterikeskuksen www-sivut. Viitattu 13.5.2015. www.vrk.fi.

SUUNNITELLUT RASTIPISTEET:

Rasti 1		ETSINTÄTEHTÄVÄ VENEESTÄ
Kuvaus:		Veneellä ajelutetaan lapsia paikkaan, jossa he etsivät veden varaan joutunutta pelastusnukkea.
Vapaaehtoiset tilla:	ras-	3 veneessä, 1 maalla +varahenkilöt
Tarvittava välineistö:		Vene, pelastusliivit, harjoitusväline
Rasti 2		VEDENALAINEN KAMERA
Kuvaus:		Vedenalaisella kameralla etsitään laiturin viereältä / alta etsitään veden alle piilotettua esinettä
Vapaaehtoiset tilla:	ras-	1-2 maalla +varahenkilöt
Tarvittava välineistö:		Kamera, esine/esineet veden alle
Rasti 3		PELASTUSLIINAN HEITTO
Kuvaus:		Kast-liinan tarkkuusheitto kuivalla maalla.
Vapaaehtoiset tilla:	ras-	1-2 + vaihtohenkilöt
Tarvittava välineistö:		Kast-liina, maali
Rasti 4		PINTAPELASTUSPUKUJEN PUKEMINEN
Kuvaus:		Lapsille puetaan pintapelastuspuvut ja he pääsevät testaamaan vedessä miltä tuntuu kellua
Vapaaehtoiset tilla:	ras-	Ainakin 1 vedessä ja 1 maalla + vaihtohenkilöt

Tarvittava välineistö: Pintapelastuspuvut (6kpl Suomen Meripelastus-seuralta)

Rasti 5	TIETOISKU	MERI-	JA
	JÄRVIPELASTUKSESTA –VIDEO		

Kuvaus: Esitetään pelastusasemalla videota meripelastusseuran toiminnasta + vapaaehtoinen kertomassa toiminnasta

Vapaaehtoiset ras- 1 henkilö + vaihto
tilla:

Tarvittava välineistö: Video, videotykki, esitteet

Rasti 6	PELASTUSLIIVIEN PUKEMINEN
----------------	----------------------------------

Kuvaus: Ennen pelastusveneeseen menoa opetellaan pukemaan pelastusliivit oikeaoppisesti päälle

Vapaaehtoiset ras- 1-2 + vaihtohenkilöt
tilla:

Tarvittava välineistö: Pelastusliivejä

Rasti 7.	SOLMUJEN TEKO
-----------------	----------------------

Kuvaus: Lapset pääsevät harjoittelemaan solmujen tekoa

Vapaaehtoiset ras- 1-2 + vaihtohenkilöt
tilla:

Tarvittava välineistö: Narua

Perheiden toimintapäivä 8.8.2015

Palautelomake yhteistyökumppaneille

Miten perheiden toimintapäivä teidän näkökulmastanne sujui?

Miten koitte yhteistyön sujuvuuden projektin vetäjien kanssa
(Pasi Risku/Jenny Saarinen)?

Saiko yrityksenne/yhdistyksenne tapahtumassa näkyvyyttä?

Mitä parannusehdotuksia teillä olisi toimintapäivään?

Vapaa palaute ja terveiset

KIITOS VASTAUKSISTA!

Perheiden toimintapäivä 8.8.2015

Palautelomake yleisölle

Ympyröi sopivin hymynaama

Oliko tapahtuma mielenkiintoinen?



Oliko rastipisteitä sopivasti?



Olisitko halunnut enemmän tekemistä?



Mistä saitte tiedon tapahtumasta?

- ☐ Järvipelastajien lehti ☐ Ala-Satakunta ☐ Tapahtuman mainos
☐ Facebook ☐ Kaverilta, sukulaiselta tai tutulta
☐ Koulun/kunnan ilmoitus ☐ Muu, mikä _____

Vapaa palaute ja terveiset:

KIITOS VASTAUKSISTA!

Perheiden toimintapäivä 8.8.2015

Palautelomake Pyhäjärven Järvipelastajille

Miten perheiden toimintapäivä sinun näkökulmastasi sujui?

Miten koit yhteistyön sujuvuuden projektin vetäjien kanssa
(Pasi Risku/Jenny Saarinen)?

Saitko tarpeeksi ohjeistusta päivän kulusta ja mitä kuuluu tehdä?

Mitä parannusehdotuksia sinulla olisi projektin vetäjille?


Vapaa palaute ja terveiset

KIITOS VASTAUKSISTA!

RASTIPASSI

Lapsiperheiden toimintapäivä 8.8.2015

Nimi: _____

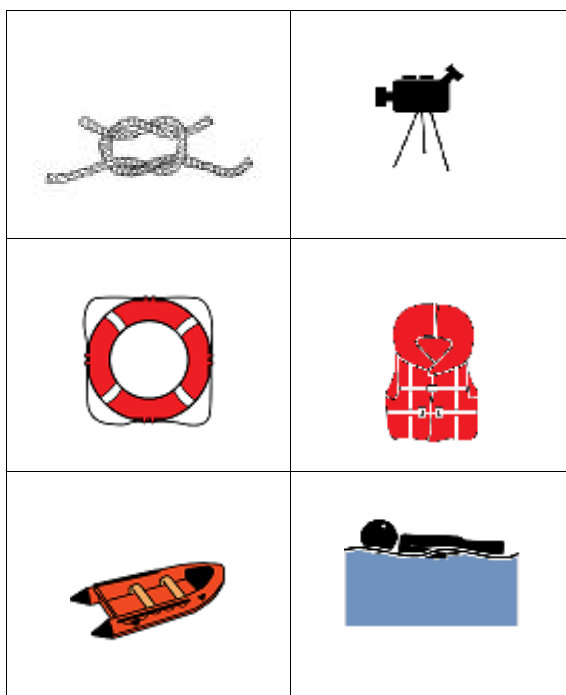

LAPSIPERHEIDEN TOIMINTAPÄIVÄ 8.8.2015 KELLO 12–15

Ohjelmassa toimintarasteja, solmujen tekoa, pelastusliinan heittoa, pelastusliivien pukemisen harjoittelua, pintapelastuspuvun käyttöä ja etsintää veneestä ja rannalta.

**Tule kokeilemaan miltä tuntuu olla
JÄRVIPELASTAJA**

Puffetti

**Paikka: Pyhäjärven järvipelastajien pelastusasema
Rantatie 238 Säkylä**

Yhteistyössä: Pyhäjärven järvipelastajat, LähiTapiola, Suomen Meripelastusseura, Säkylän MLL, Metkahinta, ILO Adventures, ja Antin konditoria



MERPELASTUSSEURA
PYHÄJÄRVEN JÄRVIPELASTAJAT



MERPELASTUSSEURA
SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET



Tapahtuman suunnittelijoina Satakunnan Ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat P. Risku ja J. Saarinen
